

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 1 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>	

# KOSTT

## Raport për tremujorin e tretë 2011

(01.07.2011-30.09.2011)

	<b>Përgatiti</b>	<b>Kontrolloi</b>	<b>Aprovoi</b>
Emri Mbiemri	Shpresa Kursani	Fadil Ismajli KSHE	Kryesuesi i BD Ramadan Paçarada
Nënshkrimi			
Data	<i>Tetor, 2011</i>		

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 2 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

**Raport Tremujor për Bordin e Drejtorëve në KOSTT**  
**Periudha Korrik - Shtator 2011**

1	<b>Titulli i Dokumentit</b>	Raport Tremujor 2011
2	<b>Dërguesi i dokumentit</b>	Fadil Ismajli, Kryeshef Ekzekutiv
3	<b>Përmbajtja e Raportit</b>	<p><b>Kapitulli 1:</b> Pasqyra e strukturës organizative dhe ndryshimet që janë bërë gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011</p> <p><b>Kapitulli 2:</b> Shqyrtim i performancës afariste dhe financiare</p> <p>2.1. Raport i realizimit të Indikatorëve Kyç të Performancës – operimi i sistemit dhe operimi i transmisionit</p> <p>2.2. Raport i operimit të tregut</p> <p>2.3. Statusi i investimeve (projekteve) kapitale në KOSTT</p> <p>2.4. Çështjet Rregullative</p> <p>2.5. Shqyrtimi i performancës financiare</p> <p>2.5.1. Pasqyrat financiare (Balanci i Gjendjes dhe Pasqyra e Fitimit/Humbjes, Realizimi i projekteve kapitale nga BK gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011)</p> <p>2.5.2. Analiza e IKP-ve financiare</p> <p><b>Kapitulli 3 :</b> Përmbledhja dhe përshkrimi i procedurave gjyqësore</p> <p><b>Kapitulli 4:</b> Kontratat/Transaksionet e konsiderueshme gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011 nga burimet e KOSTT</p> <p><b>Shtojcë 1:</b> Raporti për funksionimin e qeverisjes korporative</p>
4	<b>Data e Raportimit</b>	

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 3 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## Hyrje

Raporti i tremujorit Korrik – Shtator 2011 është përpiluar bazuar në dispozitën e nenit 31.1 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, ku brenda 30 ditëve pas përfundimit të çdo tremujori kalendarik, zyrtarët e NP-së do të përgatisin një raport për tremujorin e sapo përfunduar (“tremujori përkatës”) i cili i dorëzohet Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it për miratim.

Pas aprovimit të këtij Raporti nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it, ky Raport do të dërgohet te Njësia për Politikën dhe Monitorimin të NP-ve.

Raporti paraqet rezultate kryesore të aktiviteteve të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve gjatë tremujorit të tretë të këtij viti si dhe të aktiviteteve krahasuar me planin vjetor dhe shkallën e realizimit.

Në kapitujt e këtij Raporti, paraqiten të dhënat kryesore për strukturën organizative dhe ndryshimet e bëra, shqyrtimi i performancës afariste dhe financiare, e shprehur edhe me Indikatorët Kyç të Performancës (IKP) teknike dhe financiare, të dhënat rreth operimit të tregut, projektet aktive në KOSTT të paraqitura sipas vlerës, afateve dhe statusit të tyre, procedurat gjyqësore ose të arbitrazhit të pambaruar, transaksionet e konsiderueshme të tremujorit të tretë, për të përfunduar me Shtojcën, e cila paraqet funksionimin e qeverisjes korporative të KOSTT-it.

Përbërja e Raportit është identike me përbërjen e definuar në nenin 31.1 të Ligjit Nr. 03/L-087.

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 4 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## 1. Pasqyra e strukturës organizative dhe ndryshimet gjatë tremujorit të dytë 2011

### 1.1. Organizimi

Struktura organizative e KOSTT-it e përbërë nga Bordi i Drejtorëve dhe Menaxhmenti. KOSTT është përcaktuar të ketë një afarizëm të pavarur dhe si i tillë reflekton një fushëveprim bilateral të afarizmit.

Organizimi i KOSTT është bazuar në afarizmin themelor tekniko-operativ, ku mbulohet me Departamentet:

- Operatori i Sistemit
- Operatori i Transmisionit
- Operatori i Tregut

Afarizmi tjetër ka karakter projektues, komercial, rregullativ, ligjor, marrëdhënieve me punëtorë, administrativ, zhvillimit të personelit, teknologjisë së informacionit dhe zhvillohet përmes Departamenteve mbështetëse:

- Inxhinieringu dhe Menaxhimi i Projekteve
- Çështjet Ligjore dhe Rregullative
- Financat
- Burimet Njerëzore dhe
- Prokurimit

Në Drejtorinë Qendrore të KOSTT-it janë edhe tri njësi, të emëruara si Zyre, të cilat kanë karakter mbështetës në aspektin e obligimeve financiare, ligjore dhe organizative, që janë:

- Zyra për Zhvillim dhe Planifikim Afatgjatë
- Zyra për Komunikim dhe Relacione me Publikun dhe
- Zyra për Siguri Industriale dhe Mjedis

Afarizmi i KOSTT zhvillohet nga 8 (tetë) Departamente, 3 (tri) Zyre të përbëra në strukturën e Drejtorisë Qendrore. Në strukturën e KOSTT gjithashtu janë të përfshirë edhe pozitat e Kryeshefit Ekzekutiv, 2 (dy) Zëvendës të KSHE, njeri me përgjegjësi për operim ndërsa tjetri për zhvillim, Sekretarit të Kompanisë, Zyrtarit Kryesor Financiar dhe të Trezorit, si dhe Zyrtarit për Auditimin e Brendshëm.

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 5 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## 1.2. Numri i Punëtorëve

Me datën 1 korrik 2011 numri i punëtorëve në KOSTT ka qenë 244, ndërsa më 30 shtator 2011 numri i përgjithshëm i të punësuarve ka rënë në 241.


Arsye e zvogëlimit të numrit të punëtorëve është:

- 1 (një) punëtori i është ndërprerë marrëdhënia e punës me kërkesën e tij
- 2 (dy) punëtorë janë pensionuar gjatë muajit Shtator 2011

Nga numri i përgjithshëm i punëtorëve 241, prej tyre:

- 2 punëtorë gjenden në pushim pa pagesë
- 1 punëtore gjendet në pushim të lehonisë

Në vazhdim është dhënë Organogrami – Makro Struktura organizative aktuale e KOSTT-it

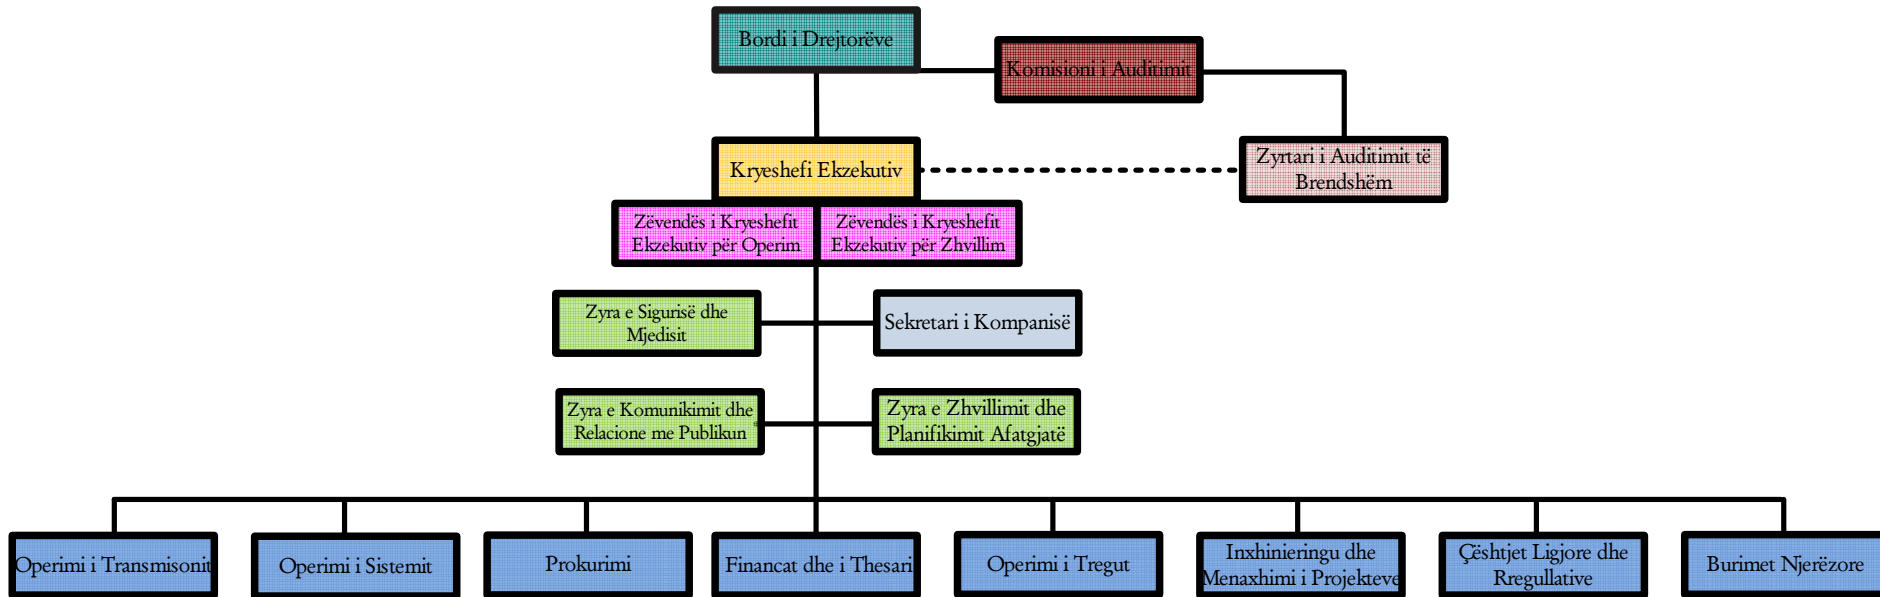

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 7 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## Shqyrtimi i performancës afariste dhe financiare

### 2.1. Raport për operimin e sistemit dhe transmissiionit për Indikatorët Teknik të Performancës

#### 2.1.1. Bilanci i planifikuar dhe i realizuar për Korrik-Shtator 2011


	Muajt	Korrik-Shtator		
		MWh	E planifikuar	E realizuar
1	TC Kosova A	285 660	457 002	159.98
2	TC Kosova B	881 496	800 404	90.80
3	HC Ujmani	14 000	14 631	104.50
4	HC Lumbardhi	28 699	3 249	11.32
5	(1+2+3) Prodhimi gjithsejt	1 181 156	1 272 037	107.69
6	Devijimi	0	- 1 022	
7	Eksporti	0	199 810	
8	Importi	67 275	79 670	118.42
9	(5-6-7+8) Energjia në disponim	1 248 431	1 152 918	92.35
10	Distribucioni	941 862	872 344	92.62
11	Ferronikeli	170 963	141 105	82.54
12	Trepça	5 400	4 915	91.02
13	Sharri	18 900	18 551	98.15
14	Mihjet, Kosova Thëngjilli	29 100		
15	Shpenzimet e gjen.nga transm.(LP290,B1,B2,T12,T34,T35,T45)		93 804	
16	(10+11+12+13+14+15) Kërkesa neto	1 166 225	1 130 719	96.96
17	Humbjet në transmision	37 453	22 212	59.30
18	(16+17) Kërkesa gjithsej	1 203 678	1 152 918	95.78

Të dhënat e planifikuara janë marrë nga dokumenti Balanca Vjetore e Energjisë Elektrike 2011, ndërsa të dhënat e realizuara nga pikat matëse dhe të transferuara në kufi të Kosovës.


Të dhënat në tabelë janë ilustruar edhe në diagramin vijues:

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 8 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

**Balanca e planifikuar Korrik-Shtator 2011**

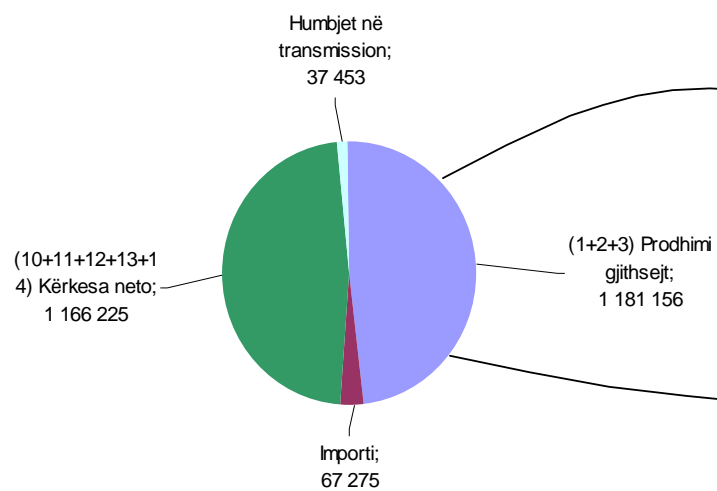


**Balanca e realizuar Korrik-Shtator 2011**

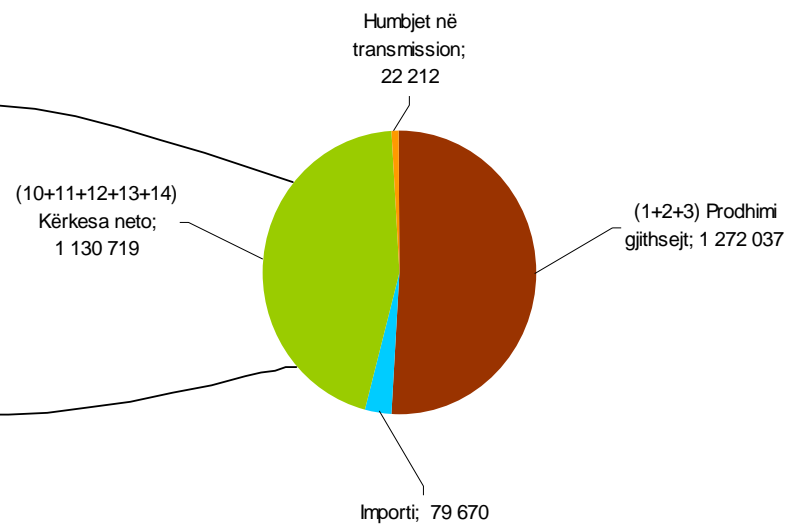



## Diagrami i bilancit të realizuar elektroenergjetik Korrik - Shtator 2011 (GWh)

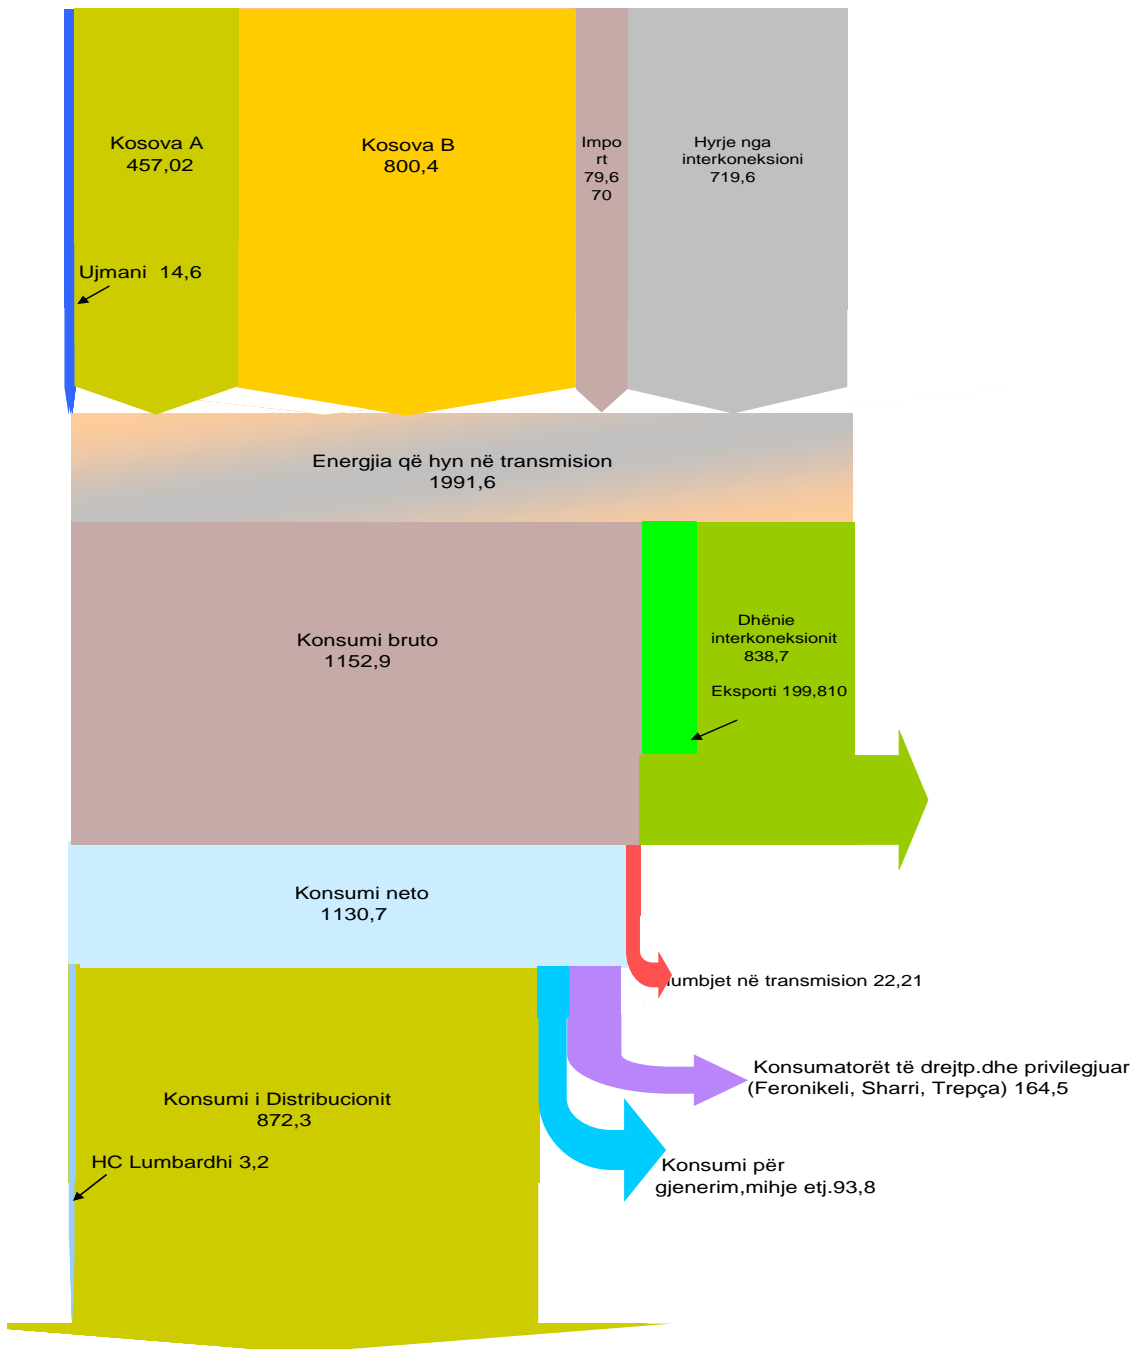

	<b>RAPORT TËRREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 10 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

### 2.1.2. Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i sistemit

Nr	Indikator		2010	2011	2011/2010(%)	Caku	Komenti
			Korrik-Shtator 2010	Korrik-Shtator 2011			
T1	Energjia e transmetuar (GWh)		2030,74	1991,69	98,08	Nuk mund të vendoset sepse nuk mund të parashihet transiti, e me këte as hyrjet totale në transmision	Caku nuk vendoset për këtë IKP,
T2	Piku koincident (MW)		792	740	93,43	Caku: 1060MW (Sipas: Balanca Vjetore e Energjisë Elektrike 2011).	Caku nuk vendoset për këtë IKP,
T3	Gjatësia totale e linjave (km)	400 kV	181,815	181,815	100,00	= > 1	Caku mund të vendoset për çdo vit me ndërtimin e linjave të reja ose riparimin/rindërtimin e linjave të cilat aktualisht nuk janë në operim. Ky cak bazohet në Planin Zhvillimor të Transmisionit.
		220 kV	231,882	231,882	100,00		
		110 kV	672,1085	727,6	108,26		
T4	MVA-km	400 kV	239450	239450	100,00	= > 1	Caku është si në T3
		220 kV	77506	77506	100,00		
		110 kV	78279	80573	102,93		

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 11 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

<b>T5</b>	Kapaciteti i transformatorëve	400-220;400-110 kV	1500	1500	100,00	= > 1	Ky cak mund të vendoset për çdo vit për instalimin e transformatorëve të ri.
		220-110 kV	1050	1200	114,29		
<b>T6</b>	Kapaciteti i Disponueshëm Mesatar Import/Eksport(AATC)						I paaplikueshëm për shkak që KOSTT nuk është anëtare e ENTSO-E
<b>T7</b>	Kapaciteti i Disponueshëm Maksimal Import/Eksport MATC						I paaplikueshëm për shkak që KOSTT nuk është anëtare e ENTSO-E
<b>T8</b>	Pagesa për kongestion						KOSTT do të filloj kur ATC do të alokohet nga OT/kontrollohet nga OS për TTC teknike.
<b>T9</b>	Koha mesatare e ndërprerjes (AIT minuta/vit)		102,89	16,25	15,79	Caku vendoset sipas raportit: (AIT për periudhen actuale)/(AIT për periudhen e kaluar) < 1	AIT (Koha mesatare e rënjes) 102,89 minuta gjatë tre muajve Korrik-Shtator 2010, ndërsa 16,25 minuta për periudhen e njëjtë 2011
<b>T10</b>	Numri i ankesave për tension		2	0	0	Nr i përgjigjeve / Nr ankesave =1	Caku për ankesa për tension duhet të ndërlidhet me numrin e ankesave në vitin (et) paraprak në periudhen e njëjtë dhe mundësia e zgjidhjes së ankesës duhet të jetë në kohë sa më të shkurtë.
<b>T11</b>	Ankesat e zgjidhura për tension	Më pak se një javë	2	0	0	Nr i përgjigjeve / Nr ankesave =1	Caku për zgjidhjen e ankesave për tension duhet të jetë sa më i shkurtër që të jetë e mundur(< 1 javë). Kjo nënkupton që përqindja më e

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 12 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

							lartë në kategorinë e parë, është më mirë.
		Më pak se një muaj				Nr i përgjigjeve / Nr ankesave = 1	Caku për ankesa të matjeve duhet të ndërlidhet me numrin e ankesave për vitin(et) paraprak(e).
		Më shumë se një muaj				Nr i përgjigjeve / Nr ankesave = 1	
<b>T12</b>	Numri i ankesave për matje		0,00	0			
<b>T13</b>	Ankesat e zgjidhura për matje	Më pak se një javë	0,00	0		Nr i përgjigjeve / Nr ankesave = 1	Caku për zgjidhjen e ankesave për matje duhet të jetë sa më i shkurtër që të jetë e mundur (< 1 javë). Kjo nënkupton që përqindja më e lartë në kategorinë e parë, është më mirë.
		Më pak se një muaj				Nr i përgjigjeve / Nr ankesave = 1	
		Më shumë se një muaj				Nr i përgjigjeve / Nr ankesave = 1	
<b>T14</b>	Vlera mesatare absolute e devijimeve orare Programi (MWh/orë)	Import	17,78	23,20	130,53	20MWh/h tërheqje jashta programit të deklaruar	Stafi i Qendrës së Kontrollit ka për qëllim që devijimet mesatare absolute në orë të programeve të importeve/eksporteve të jenë sa më të vogla.
		Eksport	16,03	20,03	125,00	20MWh/h shtyerje jashta programit të deklaruar	
<b>T15</b>	Humbjet në transmision (GWh)		29,03	22,21	76,51		Humbjet e energjisë elektrike në transmision kanë qenë më të vogla në periudhën Korrik-Shtator 2011 se sa në periudhën Korrik-Shtator 2010

$AIT = (8760 * 60 * ENS) / TE$

ENS-Energy not supplied - EPF-Energjia e pafurnizuar

TE-Transmitted energy - ET- Energjia e transmetuar

AIT- Average interruption time - KMR - Koha mesatare e rënieve

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 13 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

### 2.1.3. Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i transmisionit

Nr	Indikatori	Niveli i tensionit	Vlera mesatre	2011	Krahasimi	Caku	Komenti
		kV	2008-2009-2010	Korrik - Shtator	2011/2008-2009-2010 (%)	< = 1	
T1	Numri i prishjeve në linja në 100km gjatësi	400	<b>3.55</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	<b>3.43</b>	<b>0.86</b>	25.07		
		110	<b>5.47</b>	<b>0.41</b>	7.5		
T2	Koha mesatare e riparimit të prishjes në linjë(orë)	400	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	<b>7.35</b>	<b>2.44</b>	33.2		
		110	<b>16.70</b>	<b>2.42</b>	14.5		
T3	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së linjës (minuta)	400	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0		
		110	<b>3.44</b>	<b>0.00</b>	0		
T4	Numri i prishjeve në transformator në 100 transformator(njësi)	400/220(110)	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220/110	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0		
T5	Koha mesatare e riparimit të prishjes në transformator(orë)	400/220(110)	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220/110	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0		
T6	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së transformatorit (minuta)	400/220(110)	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220/110	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0		

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 14 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

T7	Numri i prishjeve në stabilimente të TL në 100 fusha	400	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	<b>16.53</b>	<b>0.00</b>	0		
		110	<b>16.64</b>	<b>0.00</b>	0		
T8	Koha mesatare e riparimit të prishjes në stabiliment (orë)	400	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	0		
		110	<b>8.52</b>	<b>0.00</b>	0		
T9	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së stabilimentit(fushës)(minuta)	400	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0		
		110	<b>3.35</b>	<b>0.00</b>	0		
T10	Numri i prishjeve në mbrojtje rele/kontroll në 100 fusha	400	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	<b>8.54</b>	<b>0.00</b>	0		
		110	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0		
T11	Koha mesatare e riparimit të prishjes në mbrojtje rele/kontroll (orë)	400	<b>3.00</b>	<b>2.77</b>	92.33	< = 1	Performancë pozitive
		220	<b>5.80</b>	<b>2.10</b>	36.2		
		110	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0		
T12	Koha mesatare shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së mbrojtjes rele/kontrollit (minuta)	400	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0		
		110	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	0		

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 15 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## 2.2. Raport mbi operimin e tregut


### 2.2.1. Madhësia e Tregut

Tregu i energjisë elektrike në Kosovë është treg bilateral ku pjesa më e madhe e tregut është e rregulluar dhe mungon konkurrenca në tregun me shumicë dhe atë me pakicë. Ekziston vetëm një furnizues që furnizon konsumatorët e rregulluar dhe ata të pa rregulluar.

Të drejtën e konsumatorit të kualifikuar e shfrytëzon Feronikeli por meqenëse nuk ka furnizues tjerë të licencuar Feronikeli është furnizuar nga furnizuesi publik me çmim të parregulluar. Për shkak të mungesës së konkurrencës dhe furnizuesve të tjerë dhe sipas ligjeve të reja, lejohet që konsumatori i kualifikuar të furnizohet nga Furnizuesi Publik me çmim të rregulluar, i cili ndryshon nga niveli i tensionit ku ata janë të kyçur. Është arritur marrëveshja midis KEK, Feronikelit dhe ZRrE, që Feronikeli të furnizohet nga KEK - Furnizimi me çmim të rregulluar, në nivelin 220kV. Prandaj, madhësia e tregut që i referohet segmentit të pa-rregulluar do të paraqitet vetëm në këtë tremujor si raport i energjisë së konsumuar nga konsumatorët e privilegjuar (kualifikuar) në raport me konsumin e përgjithshëm në Kosovë. Kjo përfshinë energjinë e përgjithshme që ka dalë nga transmissioni dhe energjinë që ka hyrë në distribucion nga Lumbardhi, e cila gjithashtu është pjesë e konsumit. Konsumi tarifor (pa Feronikelin) në nivel me pakicë në Korrik-Shtator '11 ishte mesatarisht rreth 79.28% të konsumit të përgjithshëm bruto (duke mos përfshirë humbjet në transmision).

Në figurën e dhënë në vijim është paraqitur figurativisht madhësia e tregut të rregulluar (tarifor) në raport me tregun e parregulluar. Konsumi i KEK nga rrjeti i transmissioinit për nevoja vetjake, i cili është i veçantë nga tregu tarifor dhe ai jo-tarifor është i paraqitur gjithashtu në figurë


*Tregu tarifor dhe jo tarifor në raport me konsumin*

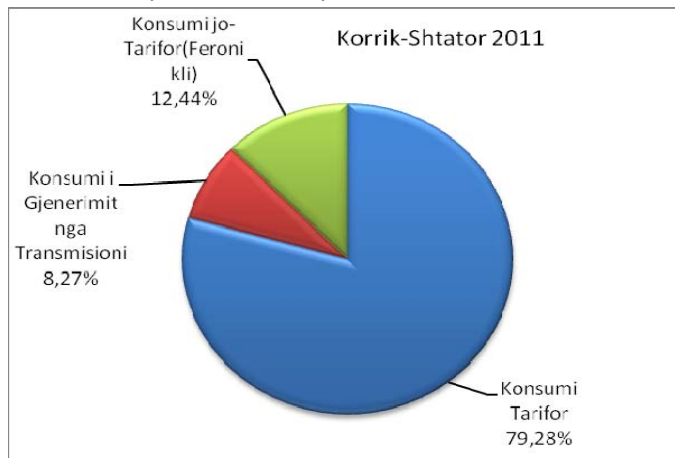


Në vijim është paraqitur bilanci i rrjedhave të energjisë në rrjetin transmetues të KOSTT. Siç shihet, mbi 30.81% të rrjedhave fizike të energjisë nëpër rrjetin transmetues janë tranzit i energjisë për nevoja regionale, dhe për këtë shërbim, KOSTT edhe më tutje nga mekanizmi i ITC-së nuk është duke u kompensuar por kompensohet EMS ( TSO e Serbisë).

*Bilanci i rrjedhave të energjisë në rrjetin transmetues për Korrik-Shtator 2011*

*Energjia që ka hyrë në rrjetin transmetues*

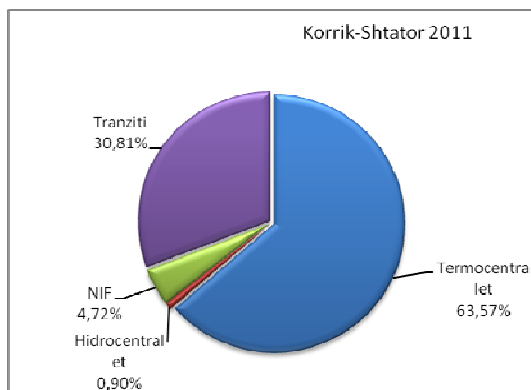

*Energjia që ka dalë nga rrjeti transmetues dhe humbjet në transmision*

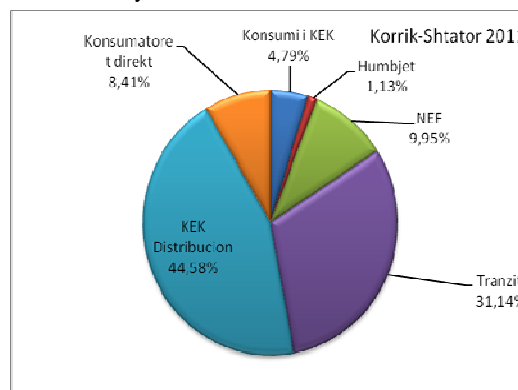

Në tabelën në vijim janë dhënë çmimet e rregulluara dhe të parregulluara në tregun e energjisë elektrike në Kosovë për tremujor të njëjtë 2009, 2010, 2011.



	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 17 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

Çmimet e energjisë elektrike të prodhuar në Kosovë janë marrë nga modelet tarifore 2009, 2010, 2011.

Në çmimin mesatar të sistemit ndikon dukshëm sasia e importit dhe çmimi i tij. Siç shihet nga tabela, çmimi i importit të energjisë elektrike ka pasur rënie dhe si pasojë e kësaj, edhe çmimi i ponderuar i energjisë elektrike ka pasur rënie nga viti 2009 deri në vitin 2010, ndërsa në vitin 2011 kemi ngritje të çmimit mesatar të sistemit ku një nga arsytet është edhe ngritja e çmimit të importit në këtë tremujor.

***Çmimet e rregulluara dhe të parregulluara të energjisë elektrike***

		2009 €/MWh	2010 €/MWh	2011 €/MWh
Çmimet e rregulluara	Kosova B	23.32	23.35	24.4
	Kosova A	23.32	23.35	24.4
	HC Ujmani	24	27.4	27.5
	HC Lumbardhi	40	40	40
Çmimet e parregulluara	Importi - çmimi mesatar	75,89	57,95	73.25
	Eksporti - çmimi mesatar	20,17	26,45	41.90
<b>Çmimi mesatar i ponderuar i sistemit</b>		<b>25,78</b>	<b>24,15</b>	<b>27.77</b>

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 18 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## 2.1. Statusi i investimeve (projekteve) kapitale në KOSTT

	Projekti	Buxheti	Fincuar nga	Vlera e Kontrates	Data e fillimit	Data e kompletimit	Kontraktues	Realizimi Q3	Realizimi: (i.)Progresi, (ii.) rreziku dhe pengesat	Rekomandimet
1	<i>Projekti i Rehabilitimit të NS 220/110 kV – Kosova A</i>	10,334,070.00 €	BKK / Kfw	9,881,052.73 €	17.12.2007	16.12.2009	Siemens (At)	0.00 €	Projekti është nën fazën garantuese njëvjeçare, deri më 27.10.2011	Duhet të eliminohen vërejtjet e mbetura (rrafshimi i terrenit) nga komisioni për pranim teknik
2	<i>Paket Projekti i NS 400/110 kV – Peja 3 bashkë me Linjat Ndërlidhëse 400 &amp; 110 kV</i>	23.343.233,00 €	BKK / Kfw	21.562.716,00 € (pa taksa)	10.06.2008	15.03.2010	Siemens & Umel (B&H)	1,500,000.00 €	Gjatë këtij tremujori, saktësisht 15.09.2011 komisioni intern i KOSTT ka dalë edhe njëherë me qëllim të përmbylljes së pikave të hapura. Sipas vlerësimit Siemens nuk i ka përmbyllur të gjitha obligimet . Në ndërkohë Siemensi ka ndërmar aksion të shpejtë dhe janë eliminuar të gjitha vërejtjet. Liferimi i pajisjeve rezervë nga ana e kontraktuesit është realizuar por jo komplet, për NS Peja 3, prandaj edhe obligimet rreth pagesave nuk janë përmbyllur. Sipas obligimit kontraktual KOSTT ka disbursuar mjetet financiar kfw, ndërsa për TVSH , të cilat ai i ka paguar kontraktuesi në vitin 2010, pasiqe KOSTT nuk ka pasë mjete financiare, Departamentit financiar iu është përgaditur letra mbeshtetëse konform pagesave të realizuara për realizim të pagesës. Në këtë tremujor është realizuar bartja e informatave nga	Rekomandohet të mabahet një takim me kontraktuesin dhe konsulencën ku do të diskutohet çështja e pagesës për punën e kryer për NS Skenderaj dhe gadishmërinë e kontraktuesit pas zgjedhjes së problemit të çështjes pronësoro juridike, për vazhdimësi të punëve me kushtet konform kontratës.

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 19 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

								<p>NS Skenderaj në Qendrën Dispecerike.</p> <p>Sa i përket punëve opcionale në NS Skenderaj, janë zhvilluar aktivitete në drejtim të zgjidhjes së çështjes pronësoreshme juridike për vazhdimësi të punëve. Situata mbetet e njejtë. Nëse nuk arrihet të përfundoj projekti, gjatë periudhës dimërore priten vështërsi me furnizim me energji elektrike në rajonin e Skenderajit.</p> <p>Me 01.07.2011 ka skaduar afati garantues i pajisjeve të instaluar 110kV. Sipas rregullave të menaxhimit duhet të lëshohet vërtetimi i punëve të kryera PAC, por meqenëse nuk janë kompletë për shkak të shtyllës nr.1 atëherë shtyhet lëshimi i PAC.</p> <p>Kontraktuesi ka dërguar shkresë, në të cilën konfirmon se pas përfundimit të punëve në NS Ferizaj 2 me 24.10.2011, për angazhimin e ekipeve të tij për punët në NS Skenderaj do të kërkon ekstra pagesë, për shkak të vonësive.</p>		
<b>3</b>	<p><i>Shërbime</i></p> <p><i>Konsulentësh për</i></p> <p><i>Paket Projektin NS</i></p> <p><i>400/110 kV – Ferizaj</i></p> <p><i>2 bashkë me Linjat</i></p> <p><i>Ndërlidhëse 400 &amp;</i></p> <p><i>110 kV</i></p>	700,000.00 €	ECLO	668,500.00 €	17.12.2009	17.10.2011	INGEDIA (Ro)	0.00 €	<p>Gjatë kësaj periudhe raportuese konsulenca e angazhuar nga Komisioni Evropian (ECLO)- Ingedia, ka zëvendësuar liderin e projektit për LOT 1, ka zhvilluar aktivitete në komentimin/aprovimin e dizajneve bazike për të dy LOT-at dhe përcjelljen e punëve ndërtimore dhe instaluese (për nënstacionin NS Ferizaj 2 si dhe për Linjat LP 400 &amp; 110 kV), konform kushteve të kontratës, së bashku me stafin e KOSTT . Kanë inspektuar punët ku intenziteti i punëve qenë më i madh në këtë periudhë. Ka organizuar takimet javore dhe mujore. Inspektimet në teren kanë qenë sipas planifikimit dhe gjithnjë është raportuar mbi mbarëvajtjen e punëve. Realizimi i pagesës së konsulencës është bërë nga ECLO.</p> <p>Pas aprovimit të dizajneve është vazhduar me punët ndërtimore në terren. Progresi i punëve ka vazhduar me ritëm</p>	

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 20 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

4	<i>Paket Projekti Ferizaj-2 <u>LOT-1:</u> NS 400/110 kV Ferizaj 2</i>	15,800,000.00 €	BKK	13,656,000.00 €	24.12.2009	23.10.2012	SIEMENS (At)	4,364,487.82 €	<p>të mirë dhe sipas planit dinamik të paraparë. Liferimi i pajisjeve është realizuar 95%. Instalimi i pajisjeve, kabllimi në anën 110kV ku është përfunduar diku ne 60%.Në fillim të shtatorit pritet të fillohet me komisionimin e pajisjeve. Instalimi i pajisjeve anën 400 kV kanë përfunduar diku 60%, kabllimi është në proces, përtokëzimi në anën 400kV ka përfunduar, por ka pasë probleme se një pjesë e përcuesit të bakrit dhe kabllove janë vjedhur . Punët ndertimore të shtëpizave rele kanë përfunduar. Është bërë instalimi dhe komisionimi i TR 300 MVA. Punët ndërtimore të rrethojës, murit anesor, si dhe punët rreth rrafshimit të terrenit janë në progres. Në ndërtesën komanduese janë instaluar pajisjet 10kV. Nuk ka vonesa në projekt . Janë mbajtur takimet e rregullta javore si dhe takimi mujaor , inspektimi i punëve bëhen rregullisht nga ana e kompanisë konsultuese INGEDIA dhe stafi i KOSTT . Projekti pritet te kompletohet para kohes (dy jave para kohe). Energjizimi i nënstacionit NS Ferizaj 2, bashkë me linjat ndërlihdhese 400 dhe 110 kV, pritet të bëhet me 18.10.2011.</p>	
	<i>Paket Projekti Ferizaj-2 <u>LOT-2:</u> LP ndërlihdhese 400 &amp; 110 kV</i>	7,500,000.00 €	ECLO	6,105,000.00 €	31.12.2009	30.10.2011	UMEL (B&H)	0.00 €	<p>Edhe ky tremujor karakterizohet me vazhdimësi të punëve sipas planit dinamik; janë mbajtur mbledhjet e rregullta javore dhe mujore. Punët janë realizuar sipas planit dinamik. (ii) Sipas kërkesës së Komunës së Gjilanit, është dashur të bëhet ndërrimi i trasesë në linjën NS Ferizaj 2- NS Gjilan 5, për herë të tretë dhe kontraktuesi ka qenë i obliguar të përgadisë dizajn të ri, i cili është aprovuar nga Ingedia dhe KOSTT. Gjatë kësaj kohe janë zhvilluar aktivitete në menaxhimin dhe mbikëqyrjen e punëve implementuese të linjave, kryesisht shtyllat e linjës 110 kV, drejtimi NS Gjilani 5. Problematikat e shpronësimit të tokave, ku do të ndërtohen shtylla e linjës 110 kV, drejtimi NS Gjilani 5 janë zgjidhur në regjionin e Vitisë; kanë ngel vetem ato në regjionin e Gjilanit ku problematike janë shtyllat 71, 72 dhe</p>	<p>Të zgjidhet qeshtja me pronaret e tokave per shtyllat 71;72;73, konform ligjeve ne fuqi. Komuna e Gjilanit te beje me shume bashke me Minsitrine e Financave rreht zgjidhjes se problemit te shpronësimit per keto tri shtylla.</p>

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 21 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

									73, për të cilat në vazhdimësi është duke u angazhuar stafi i KOSTT, bashkë me autoritetet komunale dhe qeveritare.	
5	<i>Shërbime Konsulentësh për Projektin e Ndërtimit të LP 400kV, Kosovë - Shqipëri</i>	1,200,000.00 €	KfW	1,154,620.00 €	24.09.2009	23.05.2010	INTEC (D)	0.00 €	Gjatë kësaj periudhe tremujorshe është vazhduar me evaluim të përzgjedhjes së ofertuesit më të mirë, ku kanë marr pjesë përfaqësuesit e KOSTT-it dhe kompania konsulente "intec" e përzgjedhur nga KfW.	
6	<i>Shërbime Konsulentësh për Projektin SCADA/EMS &amp; Telekom</i>	891,541.00 €	BKK	891,541.00 €	15.01.2008	30.10.2010	KEMA (D)	0.00 €	Stafit i konsulencës së angazhuar konform kontratës, pas përfundimit të projektit SCADA /EMS dhe Telekomunikacioni ka përgaditur Raportin Final. Me te ka dorëzuar edhe faturën e fundit për pagesë sipas marrëveshjes ekzistuese, e cila pritet të realizohet në fillim të kuartalit të katërt .	
7	<i>Paket Projekti SCADA/EMS &amp; Telekom <u>LOT-2: Telekom</u></i>	8,500,000.00 €	BKK	7,875,370.00 €	31.12.2008	30.10.2010	Areva/Komtel (F/RKS)	110,966.00 €	Sipas planit dinamik projekti është kompletuar me 30.06.2011. Është nënshkruar deklarata për kompletimin e projektit nga ana e ALSTOM&KOMTEL për përfundimin e punimeve të projektit. Ka përfunduar Periudha e Disponueshmërisë së Sistemit dhe pas kësaj pritet të nënshkruhet Çertifikata e Pranimit të Përkoshëm (parciale), me ç'rast fillon edhe periudha garantuere njëvjeçare, për ato pjesë të projektit. Gjatë kësaj periudhe kontraktuesi është anagzhuar në eliminimin e vërejtjeve nga lista e raportit të Komisionit për pranim teknik intern të KOSTT-it.	Të gjitha vërejtjet e paraqitura gjatë SAT -testimeve dhe vërejtjet që do të paraqiten nga Komisioni intern duhet të eliminohen brenda afatit te paraparë.

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 22 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

	<i>Paket Projekti SCADA/EMS &amp; Telekomi <u>LOT-2: Telekomi</u></i>	9,500,000.00 €	BKK	9,214,760.00 €	31.12.2008	30.10.2010	Enegroinvest/Areva (B&H/F)	42,658.00 €	Sipas planit dinamik projekti është kompletuar me 30.06.2011. Është nënshkruar deklarata për kompletimin e projektit nga ana e ALSTOM&KOMTEL për përfundimin e punimeve të projektit. Ka përfunduar Periudha e Disponueshmerisë së Sistemit dhe pas kësaj pritet të nënshkruhet Çertifikata e Pranimit të Përkoshëm (parciale), me ç' rast fillon edhe periudha garantuese njëvjeçare, për ato pjesë të projektit. Gjatë kësaj periudhe kontraktuesi është anagzhuar në eliminimin e vërejtjeve nga lista e raportit të Komisionit për pranim teknik intern të KOSTT-it.	Të gjitha vërejtjet e paraqitura gjatë SAT -testimeve dhe vërejtjet që do të paraqiten nga Komisioni intern duhet të eliminohen brenda afatit garantues. Kërkohej nga stafi menaxhues i projektit të NS Skenderaj që në rast se vije deri te përfundimi i linkut optik në Skenderaj , të njohtoj 10 ditë përpara, ashtu që të sigurojmë ekipin për testimin e pajisjeve të telekomit NS Skenderaj-Qendra kontrolluese.
8	<i><u>LOT 1 - Furnizimi,</u> Instalimi dhe Komisionimi i ATR3 150 MVA në NS Prishtina 4</i>	3,500,000.00 €	KOSTT	2,214,154.00 €	16.06.2009	15.04.2010	BPetrol & Electroputere (RKS/Ro)	0.00 €	Gjatë kuartalit të tretë nuk është paraqitur ndonjë problem. Afati garantues ka skaduar me 29.08.2011.	
	<i><u>LOT 2 - Furnizimi,</u> Instalimi dhe Komisionimi i Pajisjeve te TL në NS Prishtina 4</i>	800,000.00 €	KOSTT	775,202.37 €	24.07.2009	23.02.2010	SIEMENS (At)	0.00 €	Gjatë kuartalit të tretë nuk është paraqitur ndonjë problem. Afati garantues ka skaduar me 29.08.2011.	

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 23 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektor: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

9	<p><i>Shërbime Konsulentësh për Projektin e Ndërrimit të Pajisjeve të Tensionit të Lartë në NS Prizreni 2 &amp; Instalimi i ATR3, 150 MVA (LOT1) dhe TI për Operatorin e Tregut (LOT2)</i></p>	13,000,000.00€ (LOT1&2)	ECLO	634,000.00 €	05.10.2010	11.07.2012	INGEDIA (Ro)	0.00 €	<p>Konsulenca ka bërë percjelljen e punëve dhe aprovimin e dizajneve bazë në menyrë që të vazhdoj puna në implementimin e projektit, po ashtu ka bërë edhe takime në menyrë që të eliminoj të gjitha vërejtjet nga dizajni i Kontraktuesit. Është emëruar mbikëqyrësi i ri nga INGEDIA z. Salim Servi, i cili i ka percjell punët në aprovimin të dizajnit. Realizimi i pagesave është bërë nga ana e ECLO-s.</p>	<p>Konsulencës i është kërkuar që të jetë më e kujdesshme në rishikimin e dizajnit dhe punimeve ndërtimor, si dhe të emërojë sa ma shpejt mbikëqyrësin e ri dhe të kompletojë sa më shpejt organogramin me staf.</p>
10	<p><i>Ndërrimi i Pajisjeve të Tensionit të Lartë në NS Prizreni 2 &amp; Instalimi i ATR3, 150 MVA (LOT1)</i></p> <p><i>TI për Operimin e Tregut (LOT2)</i></p>	10.000.000,00	ECLO	6,308,920.00 €	10.01.2011	09.07.2012	KONCAR (Hr)	0.00 €	<p>Projekti është në fazën e përgatitjes së dizajnit bazë dhe detal. Janë aprovuar disa dokumente si: metodologjia e punëve, dizajni i pajisjeve të tensionit të lartë si dhe është diskutuar për diagramet lidhëse të mbrojtjes, dhe SCADA-së etj. Gjatë muajit shtator kanë filluar punët ndërtimore në NS Prizreni 2, si dhe është diskutuar në lidhje me dizajnin për lidhje të fushave të cilat do të riparohen në tërë nënstacionin. Projekti po menaxhohet nga kompania konsulente INGEDIA dhe stafi i KOSTT. Janë mbajtur takimet e rregullta javore me autoritet kontraktues</p> <p>Projekti nuk ka vonesa dhe po shkon sipas planit dinamik të rifreskuar</p>	<p>Në mënyrë strikte nga KOSTT është sugjeruar që të angazhohen vetëm nënkontraktues profesional dhe me eksperiencë pasi që natyra e punëve është shumë specifike dhe nën tension. KOSTT ka njoftuar kontraktuesin se nuk mbanë përgjegjësi në rast të aksidenteve nga pakujdesia e kontraktuesit apo nënkontraktuesve.</p>
				834,287.00 €	10.01.2011	09.01.2012	Siemens (At)	0.00 €	<p>Kjo periudhë karakterizohet me një intenzitet të shtuar rreth pëcaktimin dhe plotësimit të punëve në specifikim teknik; është diskutuar në lidhje me Raportin që e ka bërë konsulencia Ternar rreth plotësimeve dhe shumë pika janë sqaruar. Është dakorduar specifikimi teknik për aprovim, dhe nga ana e KOSTT janë dërguar komentet, janë mbajtur takime me kontraktuesit e projekteve tjera si SCADA/EMS dhe Sistemit financiar për të analizuar inteface-at me sistemet e tyre. Gjithashtu është dakorduar që ECLO të analizojë</p>	<p>Të sigurohet fondi për sistemin redundant të IT Market Operator, nga ana e ECLO-s.</p>

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 24 nga 41</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

									mundësinë e financimit për serverin redundant. Gjithashtu është vendosuar për vendin se ku duhet të vendosen serverat dhe kanë qenë përfaqësuesit e Siemensit për të verifikuar vendin se ku duhet të shtrihen kabllo, është filluar me shtrirje të kabllove në qendrën dispecerike. Janë organizuar një mori takimesh me karakter të koordinimit në lidhje me këtë LOT. Përveç takimit mujor është mbajtur edhe takimi me komitetin drejtues nga i cili takim ka dalë kërkesa për një takim me Siemensin për të verifikuar edhe një herë kërkesat harduerike dhe devijimet kërkesë - ofertë.	
11	<i>Ndërrimi i pajisjeve të Tensionit të Lartë në NS Kosova B ana 400 kV</i>	1.550.000.00 €	KOSTT	1.275.280.00 €	03.08.2010	02.08.2011	Siemens-Monting (At/RKS)	881,819.62 €	Projekti është zhvilluar konform planit dinamik. Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar aktivitete në menaxhimin dhe mbikëqyrjen e punëve implementuese. Fusha AT1 është kompletuar, është testuar me sukses dhe është lëshuar në punë. Edhe fusha AT2 dhe fusha e LP 437/1 është kryer dhe testuar dhe poashtu janë lëshuar në punë. Testimi i fushës lidhëse ndihmëse në raport me fushat tjera nuk është bërë por do të bëhet kur të kemi mundësi të shkyçjeve të linjave dhe fushave tjera. Projekti është përfunduar, por kanë ngel pa u testuar fusha lidhëse ndihmëse në lidheshmëri me G1 dhe G2 në NS Kosova B. Kur të krijohen kushtet teknike dhe operuese do të kompletohen edhe ato punë të mbetura.	
12	<i>Ndërrimi i përçuesit izolatorëve dhe paisjeve lidhëse në LP 125/2 dhe 125/3</i>	2,389,000.00 €	KOSTT	1.959.800.80€	01.06.2011	20.12.2011	ELSA&UKAB (Si/RKS)	293,970.12 €	Projekti është në fazën e dizajnit. Është dorëzuar dokumentacioni që është kërkuar nga KOSTT-i dhe është bërë analiza gjeologjike e tokës, mirëpo rezultate ende nuk i kemi marr. Është caktuar traseja dhe janë bërë matjet gjeodezike të trasës së linjës. Është filluar me demontimin e linjës LP 125/2 dhe është duke u përgaditur dokumentacioni i domosdoshëm që të aplikojmë për marrjen e lejes për ndërtimin (rekonstruktimin) e kësaj linje. Mbrenda muajit shtator është caktuar që të mbahet mbledhja e dytë ku do të analizohet përparimi i realizimit të këtij projekti. Është punuar në segmentin e linjës ku nuk ka probleme pronësore, gjithashtu në	Që dokumentacioni i kërkuar të jetë plotësisht sipas kërkesave të KOSTT-it



	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 25 nga 41</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

									bazë të këkesës së Ministrisë së Ambientit dhe të Mjedisit, dokumentacioni për marrjen e Lejes Urbanistike dhe Ndërtimore është kërkuar të sillet në gjuhën shqipe. Kontraktuesi ka marrë për detyrë që në afatin sa më të shkurtër ta sjell dizajnin konform ligjeve në fuqi, për marrjen e Lejes Urbanistike dhe Ndërtimore.	
13	<i>Kycja e NS Lipjanit në linjën LP 212 ( Kosova A - Ferizaj 2)</i>	1,050,000.00 €	KOSTT	1,397,094.32 €	27.06.2011	27.07.2012	UMEL (B&H)	209,564.21 €	Projekti është në fazën e dizajnit bazik dhe detal. Nga ana e kontraktuesit janë bërë disa matje gjeodezike dhe është caktuar korridori për trasenë e linjës. Nga ana e kontraktuesit është përgatitur elaborati për shpronësimin e trasesë së linjës (vendi ku do të ndërtohen shtyllat). Konform këtij elaborati dhe dizajnit të aprovuar për ndërtimin e linjës dhe konform ligjeve në fuqi është bërë aplikimi për marrjen e Lejes Urbanistike dhe Lejes Ndërtimore në Minsitrinë e Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit.	Që dokumentacioni i kërkuar të jetë plotësisht sipas kërkesave të KOSTT-it
14	<i>Ndërrimi i Mbrojtjeve Rele në NS 110/35kV Prishtina 2 dhe Prishtina 3</i>	250,000.00 €	KOSTT	168,880.32 €	11.07.2011	02.01.2012	KONCAR-KET (Hr)	25,332.05 €	Projekti është në fazën e dizajnit bazik dhe detal. Është mbajtur takimi i parë dhe i është kërkuar kontraktuesit Koncar që t'i përmbahet kërkesave të KOSTT-it në lidhje me dokumentacionin para se të fillohet me realizimin e projektit. Kontraktuesi ka sjellur dokumentacionin e kërkuar nga ana e KOSTT-it , të cilin dokumentacion e kemi aprovuar.	Të vazhdohet me aktivitetin e filluar.
15	<i>Rehabilitimi në linjat 110kV, 126/4 (pjesa e vjetër), 179/1, 1801 (ndërrimi i izolatorëve dhe urave përçuese)</i>	150,000.00 €	KOSTT	51,976.60 €	25.09.2011	17.12.2011	ELEGANCA (RKS)	0.00 €	Projekti është në fazën e dizajnit bazë dhe detal. Pengesë në realizimin e projektit mund të paraqitet sigurimi i shkyçjeve të linjave përkatëse; në veçanti i Linjes 110 kV, nr. 1801, linjë kjo që furnizon NS Palaj (Mihjet) nga NS Kosova A.	Rekomandohet që të krijohen kushte për punë për kontraktuesin, nga Departamenti i Operimit të Sistemit dhe KEK, në mënyrë që mos të kemi vonesa në kompletimin e projektit.

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 26 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

<b>16</b>	<i>Ndarja e zbarrave në dy seksione</i>	150,000.00 €	KOSTT	36,951.57 €	09.08.2011	27.01.2012	UKAB	0.00 €	Është nënshkruar kontrata , projekti është në fazën e fillimit; përgatitjes së dizajnit bazë.	
-----------	---	--------------	-------	-------------	------------	------------	------	--------	---	--

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 27 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## 2.5. Shqyrtimi i performancës financiare

### 2.5.1. Draft Pasqyrat Financiare: BILANCI I GJENDJES

	Nota	Janar-Shtator/2010	Janar-Shtator/2011	%
<b>ASETETE JO QARKULLUESE</b>		<b>80,771,477</b>	<b>94,774,806</b>	<b>117.34%</b>
Prona, Fabrika dhe Paisjet	4	64,272,204	72,348,069	112.57%
Investimet në vijim	5	16,499,273	22,426,737	135.93%
<b>ASETET QARKULLUESE</b>		<b>33,501,045</b>	<b>34,908,942</b>	<b>104.20%</b>
Stoqet,pjesët rezervë dhe veglat	6	684,333	1,191,980	174.18%
Kërkesat	7	10,163,071	6,752,349	66.44%
Kredi,Avanse dhe Depozita	8	8,147,216	6,092,114	74.78%
Tatimi i Parapaguar		300,000	171,867	57.29%
Paraja dhe Bilanci Bankar	9	14,206,425	20,700,631	145.71%
<b>TOTALI I MJETEVE</b>		<b>114,272,522</b>	<b>129,683,748</b>	<b>113.49%</b>
<b>KAPITALI I AKSIONARËVE DHE REZERVAT</b>		<b>43,898,923</b>	<b>46,333,073</b>	<b>105.54%</b>
Kapitali Aksionar	10	25,000	25,000	100.00%
Kapitali i trashëguar	11	28,346,963	28,346,963	100.00%
Fitimi i mbajtur		10,784,880	14,084,667	130.60%
<b>Fitimi aktual</b>		<b>4,742,080</b>	<b>3,876,443</b>	<b>81.75%</b>
<b>OBLIGIMET JO QARKULLUESE</b>		<b>62,192,648</b>	<b>75,707,750</b>	<b>121.73%</b>
Të hyrat e shtyera	12	62,192,648	75,707,750	121.73%
<b>OBLIGIMET QARKULLUESE</b>		<b>8,180,951</b>	<b>7,642,925</b>	<b>93.42%</b>
Obl.nga tregtia dhe obl.tjera	13	8,180,951	7,642,925	93.42%
<b>TOTAL BURIMET E MJETEVE</b>		<b>114,272,522</b>	<b>129,683,748</b>	<b>113.49%</b>

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 28 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## 2.5.2. DRAFT PASQYRA E FITIMIT DHE HUMBJES

	Nota	Plani Janar-Shtator./2010	Janar-Shtator/2010	% real/plani 2010	Plani Janar-Shtator /2011	Realiz. Janar-Shtator/2011	% real/plani 2011	% realiz 2011/2010
Të hyrat nga tarifa	15	13,496,178	14,299,561	105.95	11,050,823	11,420,255	103.34	79.86%
Të hyrat tjera	16	0	1,942,694		2,189,970	2,891,679	132.04	148.85%
<b>Të hyrat totale</b>		<b>13,496,178</b>	<b>16,242,255</b>	<b>120.35</b>	<b>13,240,793</b>	<b>14,311,934</b>	<b>108.09</b>	<b>88.12%</b>
Shpenzimet e personelit	17	1,982,439	1,840,295	92.83	1,873,913	1,959,786	104.58	106.49%
Shpenzimet e materialit		39,000	23,662	60.67	39,000	28,794	73.83	121.69%
Rregullimi sekondar		1,217,925	747,000	61.33	-	-		0.00%
Amortizimi	4	3,466,640	4,270,886	123.20	3,899,970	4,170,058	106.93	97.64%
Energjia,telofoni, uji		149,385	153,971	103.07	181,560	164,386	90.54	106.76%
Riparime dhe mirëmbajtje	18	739,397	576,698	78.00	879,787	567,914	64.55	98.48%
Derivate dhe lubrifikante		69,901	46,278	66.21	69,902	65,566	93.80	141.68%
Medicina,siguria dhe transporti	20	164,550	183,120	111.29	234,000	156,278	66.79	85.34%
Shpenzimet tjera operative	19	585,752	522,656	89.23	962,510	508,681	52.85	97.33%
Kompenzimet tjera.		69,750	93,791	134.47	75,000	86,638	115.52	92.37%
Humbjet në bartje	21	3,927,175	3,041,818	77.46	3,191,855	2,727,390	85.45	89.66%
<b>Shpenzimet totale</b>		<b>12,411,914</b>	<b>11,500,175</b>	<b>92.65</b>	<b>11,407,497</b>	<b>10,435,491</b>	<b>91.48</b>	<b>90.74%</b>
<b>Fitimi para Tatimit</b>		<b>1,084,264</b>	<b>4,742,080</b>	<b>437.35</b>	<b>1,833,296</b>	<b>3,876,443</b>	<b>211.45</b>	<b>81.75%</b>
Tatimi ne fitim	22		-					
<b>Fitimi për periudhë</b>		<b>1,084,264</b>	<b>4,742,080</b>	<b>437.35</b>	<b>1,833,296</b>	<b>3,876,443</b>	<b>211.45</b>	<b>81.75%</b>

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 29 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## 2.5.2. Analiza e IKP-ve financiare

IKP-të financiare të zgjedhura për të paraqitur performancën financiare të KOSTT-it, janë të matshëm në baza vjetore dhe në baza kuartale. Indikatorët e paraqitur në këtë tabelë janë të matshëm në baza kuartale.

Treguesit	I-IX 2010	I-IX 2011	Spjegimet
<b>T1. Fitimi operativ marginal</b> = Fitimi neto /gjithësejt të hyrat	0.29	0.27	Qëllimi është që të jetë mbi zero. Është treguesi i cili më së miri paraqet nivelin e të hyrave nga operacionet vijuese. Ky tregues matë se çfarë përqindje e të hyrave të kompanisë, mbetet pasi që ajo t'i paguaj të gjitha shpenzimet variabile si: pagat, materialet, shërbimet, etj. Sa më i lartë është ky tregues, kompania është në gjendje më të mirë.
<b>T2. Treguesi i qarkullimit</b> = asetet qarkulluese/detyrimet qarkulluese	4.09	4.57	Tregon aftësinë e kompanisë për t'i përmbushur obligimet e saj afatshkurtëra, me mjetet (asetet) e saj afatshkurtëra. Optimalja e këtij treguesi është <b>1.5</b> .
<b>T4. Mbulimi i shp.operative</b> = gjith.të hyrat/shpenzimet operative	1.41	1.37	Tregon raportin e të hyrave dhe shpenzimeve operative të realizuara Treguesi duhet të jetë <b>më i madh ose = 1</b>
<b>T5. Mbulimi i të hyrave</b> = gjith.të hyrat/ shpenzimet e lejuara	1.10	1.06	Treguesi duhet të jetë <b>më i madh ose = 1</b>

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 30 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

<b>T6. Mbulimi i shp. të lejuara = shpenzimet e lejuara/gjithësejt të hyrat</b>	0.91	0.95	Treguesi duhet të jetë më i vogël se 1 ose = 1
<b>T7. Gjith. të hyrat ndaj të hyr. të lej = gjith. të hyrat e rregulluara/ të hyrat e lejuara</b>	1.20	1.24	Këtu vihen në raport vetëm të hyrat e rregulluara të realizuara dhe të hyrat e lejuara. Treguesi duhet të jetë = 1. Për shak të rrjedhave më të mëdha të energjisë, treguesi është më i madh se 1.
<b>T12. Shpenzimet e lejuara për GWh e transmetuara</b>	3.74	2.14	Ky indikator ndërlidhet me metodologjinë e tarifave të ZRrE-së, e cila për periudhën raportuese ka lejuar shpenzimet totale për njësi 2.14 m €/GWh. Ky indikator tutje analizohet duke iu referuar treguesit T14, që paraqet shpenzimet totale (të realizuara) për njësi, ku shihet se KOSTT ka transmetuar energji me shpenzimet reale 1.65 m €/GWh.
<b>T13. Të hyrat e lejuara për GWh e transmetuara</b>	3.43	1.82	Paraqet të hyrat për njësi. Objektivi: Efikasiteti në terma relative të shpenzimeve që i referohen humbjeve teknike
<b>T14. Shpenzimet totale për njësi = shpenzimet totale/GWh e transmetuara</b>	2,92	1.65	Objektivi: Efikasiteti në terma relative të shpenzimeve që i referohen humbjeve teknike.

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 31 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

### 3. Përmbledhja dhe përshkrimi i procedurave gjyqësore

Nr.	Lënda nr.	Pranë	Objekti i kontestit	Vlera e kontestit	Statusi	Statusi	
1	Lënda Civile nr. 2248/03	Gjykata Komunale në Prishtinë	dëmshpërblim për lëndim në vendin e punës	92,000.00	Seanca me dt.23.03.2009. KOSTT ka kërkuar që lënda ti dërgohet KEK-ut për shkak të kompetencës.	Seanca e caktuar për dt.14.07..2009, u mbajt me vonesë, KOSTT ia ka dorëzuar Përgjigjen në Padi Gjykatës dhe në seancë në tërësi hedh poshtë kërkesëpadinë e Paditësit si të pabazë.Pritet Aktgjykimi.	Seanca 01.04/11, shtyhet, seanca e dt.21.04 për dt.12.05/11.
2	Lënda penale nr.326/05	Gjykata Komunale në Kaçanik	vjedhje	2,370.00	Seanca e rradhës u caktua për datën 18.11.2008; shtyhet 30.01;shtyhet 30.03.2009...	Seanca e përfundimtare me dt.17.03/09, është mbajtur Aktgjykimi.-është pranuar, Lënda me Ankesë nga Prokurori të dt.08.04.2009)	Verifikimi i fundit i lëndës-29.06/10, ende e pakryer.
3	Lënda Civile nr.85/05	Gjykata Komunale në Prishtinë	kompensim i dëmit	50,000.00	Seanca e rradhës është caktuar për datën 24.12.2008	Seanca e rradhës është caktuar për dt.10.02.2009, Mbahet seanca përfundimtare dt.11.06.2009.Refuzohet Kërkesëpadia e Paditësit.	Lënda me Ankesë në GjQ.
4	Lënda civile C1.nr.505/07	Gjykata Komunale në Prishtinë	pagesa e kamatës ligjore	nuk ka	Përfaqësuesi i KEK-ut, ka refuzuar pjesëmarrjen në seanca pa prezencën e KOSTT-it.	Është caktuar seanca me dt.01.04.2009,shtyhet. KOSTT parashtron Ankesë ne GjQ-Pr, kundër Aktgjykimit C1 505/07. Seanca e rradhës, dt.06.05.2010.	Aktgjykimi nuk është i formës së prerë

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 32 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

5	Lënda penale nr. 2406/ 06	Gjykata Komunale në Prishtinë	vjedhje	15,398.00	Aktgjykimi në favor të KOSTT-it por nuk është bërë akoma i plotfuqishëm	Nuk kemi njoftim ende për formën e prerë.	Verifikim me dt.11.06/09, Aktgjykimi nuk i është dorëzuar të Paditurve, nga dt.12.06, do t'i dorëzohet me polici
6	Lënda penale nr.320/06	Gjykata Komunale në Kaçanik	vjedhje e rëndë	9,120.00	Seanca e rradhës është caktuar për datën 14.11.2008	Seanca e caktuar për dt.27.01.2009 është mbajtur dhe pritet Aktgjykimi	Aktgjykimi me Ankesë, ne GjQ, nga dt.19.03/09 Verifikimi i fundit 29.06.2010.
7	Lënda penale 284/06	Gjykata Komunale në Lipjan	vjedhje e rëndë	Nuk është përcaktuar	KOSTT ka ushtruar Ankesën për zgjedhje të pjesërishtme (vlera e kontestit)		.Lënda me Ankesë, pritet përgjigja nga Gjykata e Qarkut.
8	Lënda civile nr. 409/06	Gjykata Komunale në Prishtinë	Lirimi i banesës	nuk ka	Seanca e rradhës nuk është mbajturur, pritet caktimi i seancës tjetër	Seanca e caktuar gabimisht nga Gjykata me dt.04.01/10(ditë pushimi).	Seanca e rradhës nuk është caktuar ende.
9	Lënda civile nr.511/00	Gjykata Komunale në Prishtinë	lirimi i lokaleve në Kurriz	nuk ka	Kontesti ka përfunduar pozitivisht për KOSTT-in. Pritet Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë	Aktgjykimi është marrë, në proces është propozimi për ekzekutim.	Ende nuk është kryer.(Paraprakisht marrëveshja me palët për lirim të Lokaleve). Lënda me Ankesë GjQPr.
10	Lënda civile nr. 2168/04	Gjykata Komunale në Prishtinë	lirimi i lokalit nga gjellëtorja në Kurriz	nuk ka	Seanca e rradhës u caktua për datën 19.11.2008	Dalja në vend me Gjykatën, dt.23.04/09, pritet Raporti i Ekspertit.	Seanca e rradhës më 17.04/09,(Përfaqëson KEK-u). Pengohet puna e Ekspertit nga Pala. Njoftohet Gjykata



	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 33 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektor: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

11	Lënda civile C.nr.588/08	Gjykata Komunale në Gjakovë	Kompenzim dëmi	1719.04	Seanca u caktua për dt.19.01.2009	Seanca e rradhës në afat të pacaktuar	KOSTT, sipas Aktvendimit C.nr.136/09 paraqet përgjigje në Padi, me dt.28.04.2009.
12	C.156/09	Gjykata Komunale Prizren	Kompenzim dëmi		I parashtruar me dt.11.03/09.		Pritet caktimi i seancës së rradhës.
13	Lëndë Civile C.nr.442/09	Gjykata Komunale- Prizren	Pengim posedi	500	...	Seanca mbahet dt.11.11/09,11,30h; shtyhet 02.12/10;14.12; 25.05...e fundit dt.07.06/11.	Gjykata bie Aktgjykim në favor të KOSTT, dt.15.07.2011. Lënda me Ankesë në GJQ.
14	Lëndë civile , Padi	Gjykata Komunale Ferizaj	kompenzimi i dëmit	200,00€	Padia e dorëzuar në Gjykatë ,26.06/09	Pritet caktimi i seancës.	
15	C.nr.1559/06	Gjykata Komunale Prishtinë	pagesa e Rentës.		KEK ka paguar - Qershor/2006.	Seanca e 06.05; 04.06, 08.07 dhe shtyhet 26.10/10	KOSTT ka dhënë dëshminë mbi legjitimitet pasiv.
16	C.nr. 270/07	Gjykata Komunale Podujevë	Kompenzim dami	100.000,€	KOSTT- I padituri III-të (Tretë)	seancat e dt:10.09; dhe 12.10/10 dorëzimi i shkresave të lëndës KOSTT-it	Seanca e rradhës sipas ftesës.
17	A.nr.888/10	Gjykata Supreme e Kosovës	Vlersimi për TP	14.000,€	Ankesa e KOSTT-it pjesërisht e aprovuar nga Bordi Komunal.	KA i parashtruar në afat ligjorë	Gjyqtarja e çështjes në pushim të zgjatur.
18	C.nr.218/11	Gjykata Komunale Ferizaj	Pengim Posedi	500 €	KOSTT- ka parashtrua Përgjigje në Padi sipas Aktvendimit të Gjykatës		Seanca e dt.20.06.11 shtyhet me 04.07;shtyhet me 05.09.11, Seanca e rradhës me 27.10.11

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 34 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

20	C.nr.503/11	GJYKATA Komunale Pejë	Pengim Posedi	nn	Sipas kërkesës së Gjykatës, KOSTT ka parashtrua precizimin e Padisë.	Pritet ftesa për seancë(para seancës sqarime me Gjyqtarin F.Baloku)	
21	C.nr.2255/06	GjK-Prishtine	Kompenzim dami	nn	Sipas kërkesës së të Atorizuarit të Padiës me zgjerim të Padisë	Seanca pas Ftesës Gjyqësore	

**Vërejtje:**

Lënda civile nr. 32/08, me Aktvendim 217/08 është e kryer me Ujdi Gjyqësore dhe Aktvendim Gjyqësor.

Lënda C.nr.503/11 dhe lënda C.nr.2255/06 janë lëndë të reja.

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 35 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

#### 4. Kontratat/transakcionet e konsiderueshme gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011 nga burimet e KOSTT

Nr	Dep	Loji i prokurimit	Emri i prokurimit	KONTRAKTORËT	LOT	Kodi buxhetor	Vlera e kontratës	Vlera e realizuar e kontratës	Vlera e perealizuar e kontratës	Kontrata	realizimi ne %	
1	Departamenti për Menaxhim të Projekteve&Inxhinieri	Furnizim	Kycja e NS Lipjanit në linjën LP212 (Kosova A - Ferizaji)	Umel Dalekovodmontaza		023/7	1,397,094.72 €	209,564.21 €	1,187,530.51 €	nr.194 dt.01.06.2011	15.00%	
12	Departamenti i OT	Furnizim	Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbitensionit në LP 400kV	ABB d.o.o. Zagreb		5320/1	100,799.06 €	- €	100,799.06 €	nr.195 dt.01.06.2011	0.00%	
13	Departamenti për Menaxhim të Projekteve&Inxhinieri	Shërbime	Ndërrimi i mbrojtjeve Rele në NS	Koncar Power Plant- Zagreb		023/2	168,880.32 €	25,332.05 €	143,548.27 €	nr.222 dt.21.06.2011	15.00%	
14	Departamenti për Menaxhim të Projekteve&Inxhinieri	Furnizim	Ndërrimi i përcuesit, izolatorëve dhe pajisjeve lidhëse në LP: 125/2,125/3	konz.ELSA & UKAB		023/5, 023/9	1,959,800.80 €	425,198.60 €	1,534,602.20 €	nr.200 dt.08.06.2011	21.70%	
15	Departamenti i OT	Furnizim	Rehabilitimi në linjat 110kV, LP 126/4(pjesa e vjetër), LP 179/1 dhe LP1801	konz.ELBNDERTUESI&ELEGANCA		5320/2	51,979.60 €	- €	51,979.60 €	nr.217 dt.20.06.2011	0.00%	
25	Departamenti i OT	Furnizim	Furnizim me pjese rezerve per mirembajtje te linjave dhe nenstacioneve	UKAB		5320/3	185,397.80 €	27,809.68 €	157,588.12 €	nr.229 dt.06.07.2011	15.00%	
27/2010	Departamenti për Burime Njerzore	Shërbime	Sigurimi Fizik i Objekteve të KOSTT sh.a	LEO SECURITY			338,791.68 €	52,430.36 €	286,361.32 €	nr.88 dt.21.03.2011	15.48%	
37/2010	Departamenti për Burime Njerzore	Furnizim	Dizajnimi, Zhvillimi dhe Implementimi i Aplikacionit për Udhëheqjen dhe Mirëmbajtjen e Aseteve	Inovativi			174,990.00 €	- €	174,990.00 €	nr.71 dt.03.03.2011	0.00%	
39	Zyra për SI dhe MKZ	Shërbime	Kontrollimi dhe servisi i aparateve zjarrfikëse	PASTOR KOSOVA		5329/19	50,000.00 €	- €	50,000.00 €	nr.260 dt.07.09.2011	0.00%	
39/2010	Departamenti për Burime Njerzore	Punë	Renovimet e EKCS-NS Kosova B për nevoja të projektit të SCADA	Ndertimtari			49,780.16 €	- €	49,780.16 €	nr.74 dt.15.03.2011	0.00%	
<b>Totali</b>								4,477,514.14 €	740,334.90 €	3,737,179.24 €	<u>16.53%</u>	16.53%

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 36 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## Shtojca 1: Raport mbi funksionimin e Qeverisjes Korporative të KOSTT-it

Raporti mbi funksionimin e Qeverisjes Korporative përfshin aktivitetet e Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it që kryhen bazuar në Ligjin nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Statutin e Kompanisë dhe Rregullorën e Punës së Bordit.

Ky Raport gjithashtu përfshinë edhe punën e Komisionit të Auditimit dhe Komisioneve të tjera të themeluara nga Bordi.

Për periudhën raportuese Korrik – Shtator 2011 Bordi ka mbajtur 2 (dy) mbledhje, një të rregullt dhe një të jashtëzakonshme, kurse Komisioni i Auditimit ka mbajtur 1 (një) mbledhje të rregullt. Gjatë kësaj periudhe, edhe Komisioni i Bordit për Linjën 400 kV Kosovë-Shqipëri ka mbajtur (1) një mbledhje, kurse Komisioni i Projekteve Kapitale i themeluar nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it gjithashtu ka mbajtur 1 (një) mbledhje. Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it ka qenë i kyçur në të gjitha aktivitetet e natyrës strategjike të KOSTT-it.

Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit janë mbajtur në periudhat kohore sipas Planit të aprovuar të Punës së Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit për vitin 2011.

Çdo mbledhje e rregullt e Bordit ka trajtuar disa pika që paraqiten në çdo mbledhje të Bordit si pika të rëndomta dhe përfshijnë: vërtetimin e kuorumit dhe aprovimin e rendit të ditës, aprovimin e procesverbaleve nga mbledhjet paraprake të Bordit të Drejtorëve dhe të Komisioneve. Mbledhjet në vijim janë paraqitur sipas datës së mbajtjes së tyre.

### **1. Mbledhja e Komisionit të Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it për Projektet Kapitale**

Komisioni i Bordit për Projektet Kapitale me datën 14 Shtator ka mbajtur mbledhjen e vet të 5-të. Bordi është njoftuar për zhvillimin në projektin SCADA/EMS & Telekom. Projekti është pranuar teknikisht nga Komisioni për Pranim Teknik Intern, pa pjesën e projektit që ishte dashur të zhvillohet në pjesën veriore të Kosovës (gjegjësisht në NS Vallaq dhe NS Ujman), për shkak të situatës politike dhe të sigurisë

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 37 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

atje. Sistemi i Komandimit dhe Monitorimit dhe Sistemi i Telekomit (SCADA/EMS & Telekomit) është në operim.

Bordi u njoftua nga menaxhmenti i KOSTT-it për problemin e mos ndërtimit të Linjës së dyfishtë 110 kV, NS Peja 3 – NS Skenderaj (rasti i ndërtimit të shtyllës në pronën e Kompanisë “Vëllezërit Geci”) dhe se nuk ka ndonjë progres në këtë drejtim, përkundër angazhimit të menaxhmentit të KOSTT-it për zgjidhjen e këtij problemi. Rrezik paraqitet edhe mundësia e paraqitjes së gjobitjes (penalltive) nga ana e kontraktuesit, për mospagim të kushteve për zbatimin e projektit, konform kontratës. Shtylla është lejuar të ngritet, por lidhja e përçuesve në mes shtyllës nr. 1 dhe 2 nuk po lejohet nga pronarët e Kompanisë “Vëllezërit Geci”, që pamundëson energjizimin e nënstacionit NS Skenderaj. Kjo situatë e krijuar është e papranueshme, pasi gjatë sezonit të dimrit, qytetarët e Komunës së Skenderajt, do të përballen me mungesë të furnizimit me energji elektrike 33% më pak se vitin e kaluar, si pasojë e instalimit të fushës transformatorike 10 (20) kV për transformatorin energjetik 31.5 MVA. Në lidhje me këtë, Komisioni për Projekte Kapitale vendosi që edhe njëherë t’i rekomandohet Bordit dërgimi i një letre zyrtare instancave më të larta relevante vendimmarrëse në Kosovë, pasi që këto dy probleme tejkalojnë kompetencat e Bordit.

Bordi është informuar në lidhje me Paket Projektin Ferizaj 2, i cili në LOT1 NS Ferizaj 2 është duke u implementuar sipas dinamikës së paraparë me planin dinamik dhe nuk ka ndonjë vështirësi në këtë drejtim.

LOT2 Linjat 400 dhe 110 kV: Projekti i Ndërtimit të Linjave 400 & 110 kV për NS Ferizaj 2 është gjithashtu duke rrjedhur sipas dinamikës së paraparë, në ndërtimin e shtyllave e me këtë edhe të linjave përkatëse, me gjithë vështirësitë që KOSTT-i i ka në zgjidhjen e çështjeve pronësore – juridike me pronarët e tokave, ku do të ndërtohen shtyllat për linjat përkatëse, konform elaboratit të shpronësimit. Problemet kryesore paraqiten në vendbanimet e Komunës së Gjilanit.

Bordi gjithashtu është njoftuar në lidhje me projektin - Rindërtimi i NS 220/110 kV – Prizreni 2 i cili po zhvillohet sipas planit dinamik dhe nuk ka ndonjë problem në këtë drejtim.

Bordi u njoftuar për vështirësitë dhe pengesat në realizimin e projekteve veçanërisht gjatë ndërtimit të objekteve elektro-energjetike, me theks të posaçëm të linjave transmetuese; në procedurat e marrjes së Lejes Urbanistike dhe Lejes Ndërtimore dhe në shpronësimin e tokave, ku do të ndërtohen shtyllat e linjave përkatëse.

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 38 nga 41</i>
<small>OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU SH.A. TRANSMISSION, SYSTEM AND MARKET OPERATOR J.S.C. OPERATOR SISTEMA, PRENOSA I TRZISTA A.D.</small>	 <i>Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>	

## 2. Mbledhja nr. 04/11 e Komisionit për Linjën 400 kV Kosovë – Shqipëri

Komisioni për Linjën 400 kV Kosovë – Shqipëri ka mbajtur mbledhjen e radhës me datën 03 Gusht 2011. Komisioni ka vlerësua informatën për zhvillimet në realizimin e Projektit të Linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri si dhe me detyrat e mëtejme. Komisioni është informuar nga menaxhmenti i KOSTT-it në lidhje me aktivitetet komercialo-financiare në lidhje me projektin. Marrëveshja rreth pengut për garantimin e të hyrave nga transiti dhe Marrëveshja e pengut për garantimin e parave të gatshme për servisimin e huasë janë firmosur me KfW-në ashtu si janë paraparë me Marrëveshjen për financim dhe kredi të lidhur në mes të KEK-ut dhe KfW-së.

Pas diskutimeve dhe sqarime shtesë për projektin e Linjës 400 kV Kosovë - Shqipëri, anëtarët e Komisionit dolën me përfundimin se procesi rreth projektit të Linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri është në rrjedhje të mirë dhe nuk ka ndonjë gjë serioze që mund ta dëmtojë këtë proces. Menaxhmenti i KOSTT-it inkurajohet për vazhdimin e punëve në realizimin e këtij projekti me një rëndësi të madhe.

## 3. Mbledhja e Komisionit të Auditimit nr. 21/11 21/11 e dt. 22 gusht 2011

Komisioni i Auditimit në mbledhjen e mbajtur më 22 Gusht 2011 ka shqyrtuar Raportin tremujor të KOSTT-it për periudhën Prill-Qershor 2011. Bordi ka konstatuar se Raporti i prezantuar i ka përmbushur kërkesat sipas IKP-ve dhe se ana financiare e raportit e shpreh arritjen e objektivave të parashikuara të kompanisë. Menaxhmenti i KOSTT-it ka dhënë shpjegime për disa pika të Raportit të cilat ishin në interesim të anëtarëve të Komisionit të Auditimit.

Si pjesë e raportit tremujor Prill-Qershor 2011 është prezantuar edhe pjesa e veçantë e Raportit në lidhje me të arriturat, pengesat dhe sygjerimet. Komisioni i Auditimit pas diskutimeve ka konstatuar se Raporti tremujor për periudhën Prill-Qershor 2011 është i përpiluar konform rregullativës ligjore, standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe i përmbush të gjitha kriteret për shqyrtim nga Bordi i Drejtorëve. Komisioni i Auditimit ka rekomanduar që Raporti Tremujor Prill-Qershor për vitin 2011 t'i prezantohet Bordit për shqyrtim dhe aprovim.

Komisioni i Auditimit ka shqyrtuar dhe analizuar Letrën e Menaxhmentit të përgatitur nga Auditori i Jashtëm KPMG dhe ka propozuar që e njëjta t'i dërgohet Bordit për shqyrtim.

Komisioni i Auditimit u informua për Raportin nga konsulentja e NJPMNP për vlerësimin e Bordit të KOSTT-it.

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 39 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

Komisioni i Auditimit u informua me vendimin e Qeverisë për transferimin e asetëve 110 kV nga KEK në KOSTT. Komisioni u informua mbi pritjen e planit aksional nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik e cila do të definojë procesin e transferimit të asetëve ekzistuese, derisa KOSTT ka definuar hapat dhe është në përgatitje e sipër të Draft Marrëveshjes që do të lidhet në mes të KEK-ut dhe KOSTT-it bazuar në Vendimin e Qeverisë për transferimin e përmendur.

#### **4. Mbledhja e Rregullt e Bordit nr. 21/11 më 24 GUSHT 2011**

Bordi në mbledhjen e rregulltë të tij me 24 Gusht 2011 është informuar me çështjet aktuale nga periudha raportuese nga Kryshefi Ekzekutiv i KOSTT-it.

Bordi gjithashtu ka shqyrtuar dhe aprovuar Raportin Tremujor të KOSTT-it për periudhën Prill-Qershor 2011. duke vlerësuar se Raporti i përmban të gjitha elementet konform dispozitave ligjore, është gjithëpërfshirës dhe janë paraqitur të gjithë IKP-të teknike dhe financiare të cilët tregojnë afarizëm pozitiv të KOSTT-it në 6 mujorin e parë të vitit 2011.

Bordi ka shprehur brengosje për një tendencë të ndryshimit që mund të ndodh në të ardhmen për shkak të zvogëlimit të tarifave nga ana e Zyrës së Rregullatorit të Enegjisë.

Bordi ka shqyrtuar Letrën e Menaxhmentit, të përgatitur nga auditori i jashtëm KPMG dhe ka udhëzuar menxhmentin e KOSTT-it që të përgatis përgjigjet dhe të përkthehet në gjuhën shqipe.

Bordi është informuar me raportin nga konsulentja e NJPMNP për vlerësimin e Bordit. Bordi ka shprehur kënaqësinë për vlerësimin e Bordit me performancë shumë të mirë dhe ka konstatuar se Raporti është produkt i punës së Bordit dhe i shërbimeve profesionale të KOSTT-it. Raporti si i tillë, do të shërbej si mirënjohje e organizimit të Bordit për punën sipas standardeve ndërkombëtare.

Bordi gjithashtu është informuar për fillimin e punëve dhe orarin e aktiviteteve për implementimin e Vendimit të Qeverisë për transferin e asetëve 110 kV nga KEK në KOSTT. Bordi ka pranuar me kënaqësi vendimin dhe ka shprehur mirënjohje për vendimmarrësit dhe se vendimi është mjaft i favorshëm për KOSTT dhe interesat e konsumatorëve të Kosovës në përgjithësi për finalizimin e asetëve për një afarizëm të suksesshëm të KOSTT.

Bordi ka shqyrtuar dhe aprovuar Procesverbalin nga mbledhja e Komisionit për ndarjen e asetëve KOSTT-KEK dhe Procesverbalin nga mbledhja e Komisionit për linjën 400 kV Kosovë-Shqipëri.

Bordi ka shqyrtuar dhe analizuar Letrën e Menaxhmentit të përgatitur nga Auditori i Jashtëm KPMG

	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 40 nga 41</i>
<small>OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU SH.A. TRANSMISSION, SYSTEM AND MARKET OPERATOR J.S.C. OPERATOR SISTEMA, PRENOSA I TRZISTA A.D.</small>	 <i>Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>	

## 5. Mbledhja e Jashtëzakonshme e Bordit nr. 21.1/11 e mbajtur me 14 Shtator 2011

Mbledhja e jashtëzakonshme e Bordit është mbajtur për shkak të aprovimit të Bordit të Vendimit për lejimin e blerjes së një poli të ndërprerësit 400kV nga ana e KOSTT-it. Mbledhja e jashtëzakonshme e Bordit u mbajt për shkak të defektit të riparueshëm në polin e ndërprerësit 400 kV në fushën gjeneratorike G2 në TS Kosova B me datën 23.08.2011. Bordi u informua se për aftësimin e kësaj fushe KOSTT-i është detyruar që urgjent ta siguroj një pol të këtij ndërprerësi me karakteristika të njëjta si poli ekzistues. Nga Bordi është kërkuar që të pajtohet me aprovimin e blerjes bazuar në arsyeshmërinë e prezantuar nga Kryeshefi Ekzekutiv sipas memos nga Drejtori i Operatori të Transmisionit të datës 13.09.2011. Bordi i Drejtorëve ka aprovuar vendimin për lejimin e blerjes së një poli të ndërprerësit 400kV me karakteristikat si poli ekzistues dhe ka udhëzuar shërbimet profesionale të KOSTT-it që të kryejnë zotimin e mjeteve financiare dhe prokurimin për këtë blerje.

## 6. Aktivitete të tjera

Drejtorët e Bordit të KOSTT-it në vazhdimësi kanë qenë në komunikim dhe bashkëveprim me menaxhmentin e KOSTT-it, që ka rezultuar me efikasitet më të madhe në marrjen e vendimeve të nevojshme.



	<b>RAPORT TREMUJOR</b>	<b>DT-PB-002</b>
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 41 nga 41</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

## Lista e shkurtesave

ATR – Autotransformatori

BK – Buxheti i Kosovës

BNJ – Burimet Njerëzore

ECLO – ( nga angl. European Commission Liaison Office) - Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian

ENTSO E - (European Network of Transmission System Operators for Electricity)- Rrjeti Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike

GjQ – Gjykata e Qarkut

IKP – Indikatorët Kyç të Performancës

KA – Konflikt Administrativ

KEK – Korporata Energjetike e Kosovës

KfW- Banka Gjermane për Zhvillim

KOSTT- Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu

LP – Largpërçuesi

NS - Nënstacioni

NP – Ndërmarrjet publike

NJPMNP – Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike

OST – Operator i Sistemit të Transmisionit

PpE - Propozim për Ekzekutim

SCADA /EMS- (System Control and Data Acquisition/Energy Managment System) -Sistemi i kontrollit dhe grumbullimit të të dhënave/Sistemi i manaxhimit të energjisë

TP – Tatimi në pronë

ZRrE – Zyra e Rregullatorit të Energjisë
