	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 1 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Spektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>




OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU KOSTT s.h.a.
TRANSMISSION SYSTEM AND MARKET OPERATOR KOSTT J.S.C
OPERATOR SISTEMA PRENOSA I TRZISTA KOSTT d.d


Mr. 339 Dt. 29/05/2012
PRISHTINE-A

KOSTT

Raport për tremujorin e parë 2012


(01.01.2012-31.03.2012)

	Përgatiti	Kontrolloi	Aprovoi
Emri Mbiemri	Shpresa Kursani	Fadil Ismajli KSHE	Kryesuesi i BD Ramadan Paçarada
Nënshkrimi			
Data	Prill, 2012		

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 2 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

Raport Tremujor për Bordin e Drejtorëve në KOSTT
Përiudha Janar – Mars 2012

1	Titulli i Dokumentit	Raport Tremujor 2012
2	Dërguesi i dokumentit	Fadil Ismajli, Kryeshef Ekzekutiv
3	Përmbajtja e Raportit	<p>Kapitulli 1: Pasqyra e strukturës organizative dhe ndryshimet që janë bërë gjatë tremujorit të parë të vitit 2012</p> <p>Kapitulli 2: Shqyrtim i performancës afariste dhe financiare</p> <p>2.1. Raport i realizimit të Indikatorëve Kyç të Performancës – operimi i sistemit dhe operimi i transmisionit</p> <p>2.2. Raport i operimit të tregut</p> <p>2.3. Statusi i investimeve (projekteve) kapitale në KOSTT</p> <p>2.4. Çështjet rregullative</p> <p>2.5. Shqyrtimi i performancës financiare</p> <p>2.5.1. Pasqyrat financiare (Balanci i Gjendjes dhe Pasqyra e Fitimit/Humbjes, Realizimi i projekteve kapitale nga BK gjatë tremujorit të parë të vitit 2012)</p> <p>2.5.2. Analiza e IKP-ve financiare</p> <p>Kapitulli 3 : Përmbledhja dhe përshkrimi i procedurave gjyqësore</p> <p>Kapitulli 4: Kontratat/Transaksionet e konsiderueshme gjatë tremujorit të parë të vitit 2012 nga burimet e KOSTT</p> <p>Shtojcë 1: Raporti për funksionimin e qeverisjes korporative</p>
4	Data e Raportimit	

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 3 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

Hyrje


Raporti tremujori Janar – Mars 2012 përmban të gjitha elemente konform nënit 31.1 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, ku brenda 30 ditëve pas përfundimit të çdo tremujori kalendarik, zyrtarët e NP-së do të përgatisin një raport për tremujorin e sapo përfunduar (“tremujori përkatës”) i cili i dorëzohet Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it për miratim.

Pas aprovimit të këtij Raporti nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it, ky Raport do të dërgohet te Njësia për Politikën dhe Monitorimin të NP-ve.

Raporti paraqet rezultate kryesore të aktiviteteve të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve gjatë tremujorit të parë të këtij viti si dhe të aktiviteteve krahasuar me planin vjetor dhe shkallën e realizimit.

Në kapitujt e këtij Raporti, paraqiten të dhënat kryesore për strukturën organizative dhe ndryshimet e bëra, shqyrtimi i performancës afariste dhe financiare, e shprehur edhe me Indikatorët Kyç të Performancës (IKP) teknike dhe financiare, të dhënat rreth operimit të tregut, projektet aktive në KOSTT të paraqitura sipas vlerës, afateve dhe statusit të tyre, procedurat gjyqësore ose të arbitrazhit të pambaruar, transaksionet e konsiderueshme të tremujorit të parë, për të përfunduar me Shtojcën, e cila paraqet funksionimin e qeverisjes korporative të KOSTT-it.

Përbërja e Raportit është identike me përbërjen e definuar në nënin 31.1 të Ligjit Nr. 03/L-087.

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 4 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

1. Pasqyra e strukturës organizative dhe ndryshimet gjatë tremujorit të parë 2012

1.1. Organizimi

Struktura organizative e KOSTT-it është e përbërë nga Bordi i Drejtorëve dhe Menaxhmenti. KOSTT është përcaktuar të ketë një afarizëm të pavarur dhe si i tillë reflekton një fushëveprim bilateral të afarizmit.

Afarizmi i KOSTT zhvillohet nga 8 (tetë) Departamente, 3 (tri) Zyre të përbëra në strukturën e Drejtorisë Qendrore. Në strukturën e KOSTT janë të përfshirë edhe pozitat e Kryeshefit Ekzekutiv, 2 (dy) Zëvendës të KSHE, njeri me përgjegjësi për operim ndërsa tjetri për zhvillim, Sekretarit të Kompanisë, Zyrtarit Kryesor Financiar dhe të Trezorit, si dhe Zyrtarit për Auditimin e Brendshëm.

Organizimi i KOSTT është bazuar në afarizmin themelor tekniko-operativ, ku mbulohet me Departamentet:


- Operatori i Sistemit
- Operatori i Transmisionit
- Operatori i Tregut

Afarizmi tjetër ka karakter projektues, komercial, rregullativ, ligjor, marrëdhënieve me punëtorë, administrativ, zhvillimit të personelit, teknologjisë së informacionit dhe zhvillohet përmes Departamenteve mbështetëse:

- Inxhinieringu dhe Menaxhimi i Projekteve
- Çështjet Ligjore dhe Rregullative
- Financat
- Burimet Njerëzore dhe
- Prokurimit

Në Drejtorinë Qendrore të KOSTT-it janë edhe tri njësi, të emëruara si Zyre, të cilat kanë karakter mbështetës në aspektin e obligimeve financiare, ligjore dhe organizative, që janë:

- Zyra për Zhvillim dhe Planifikim Afatgjatë
- Zyra për Komunikim dhe Relacionë me Publikun dhe
- Zyra për Siguri Industriale dhe Mjedis

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 5 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

1.2. Numri i Punëtorëve

Me datën 1 Janar 2012 numri i punëtorëve në KOSTT ka qenë 242, ndërsa më 31 Mars 2012 numri i përgjithshëm i të punësuarve është 239.



Gjatë kësaj periudhe ka pasur lëvizje të numrit të punëtorëve për këto arsye:


- 3 (tre) punëtorë janë pensionuar gjatë muajit janar dhe shkurt 2012

Nga numri i përgjithshëm i punëtorëve 239, prej tyre:

- 1 (një) punëtorë gjendet në pushim pa pagesë

Në vazhdim është dhënë Organogrami – Makro Struktura organizative aktuale e KOSTT-it



	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fage 7 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

Shqyrtimi i performancës afariste dhe financiare


2.1. Raport për operimin e sistemit dhe transmisionit për Indikatorët Teknik të Performancës

2.1.1. Balanca e planifikuar dhe e realizuar për Janar-Mars 2012


Muajt MWh	Janar-Mars		
	E planifikuar	E realizuar	Real/Plan%
(1) TC Kosova A	393 120	554 939	141,16
(2) TC Kosova B	1 060 899	1 040 762	98,10
(3) Energjia për shpenzime vetanake (TC A+TC B)	44 661		
(4) HC Ujmani	26 000	12 266	47,18
(5) HC Lumbardhi	4 199	2 679	63,81
(6) = 1+2+3+4 Prodhimi në prag të transmisionit	1 524 680	1 607 967	105,46
(7) Devijimi	13 761	22 756	
(8) Eksporti	0	53 691	
(9) Importi	233 680	217 337	93,01
(10) = 6-7-8+9 Energjia në disponim	1 744 599	1 748 857	100,24
(11) Distribucioni	1 448 834	1 447 803	99,93
(12) Ferronikeli	162 000	129 038	79,65
(13) Trepça	6 655	6 636	99,72
(14) Sharri	12 000	4 189	34,91
(15) Mihjet	27 000	37 845	140,17
(16) Konsumatorët e jashtëm të KEK	5 100	0	0,00
(17) Shpenzimet vetanake të TC nga transmisioni(LP290,B1,B2,T12,T34,T35,T45)	44 661	93 073	
(18) = 11+12+13+14+15+16+17 Kërkesa neto	1 706 250	1 718 585	100,72
(19) Humbjet në transmission	38 349	30 272	78,94
(20) =18+19 Kërkesa gjithsej	1 744 599	1 748 857	100,24


Të dhënat e planifikuara janë marrë nga dokumenti Balanca Vjetore e Energjisë Elektrike 2012, ndërsa të dhënat e realizuara nga pikat matëse dhe të transferuara në kufi të Kosovës.

Shpjegim: (3) Energjia për shpenzime vetanake nga (TC A dhe TC B) e cila hyn në rrjetin e transmisionit është e barabartë me energjinë që termocentralet e marrin nga rrjeti i transmisionit për shpenzime vetanake (17). Rreshti (3) në tabelë në vlerat e realizuara është e përfshirë në pikën (6)- Prodhimi në prag të transmisionit.


	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	ver. 1.0	faqe 8 nga 42
Departamenti Financiar Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti		


Të dhënat në tabelë janë ilustruar edhe në diagramin vijues:

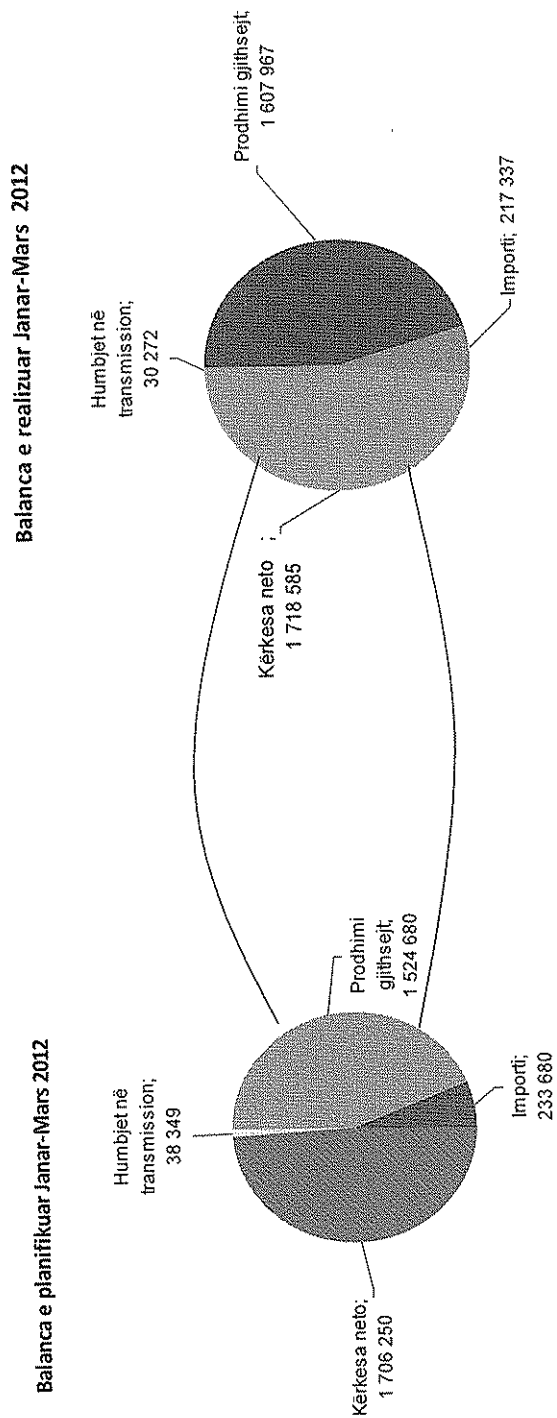

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 9 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>


Diagrami i balancës së realizuar elektroenergjetike Janar - Mars 2012 (GWh)

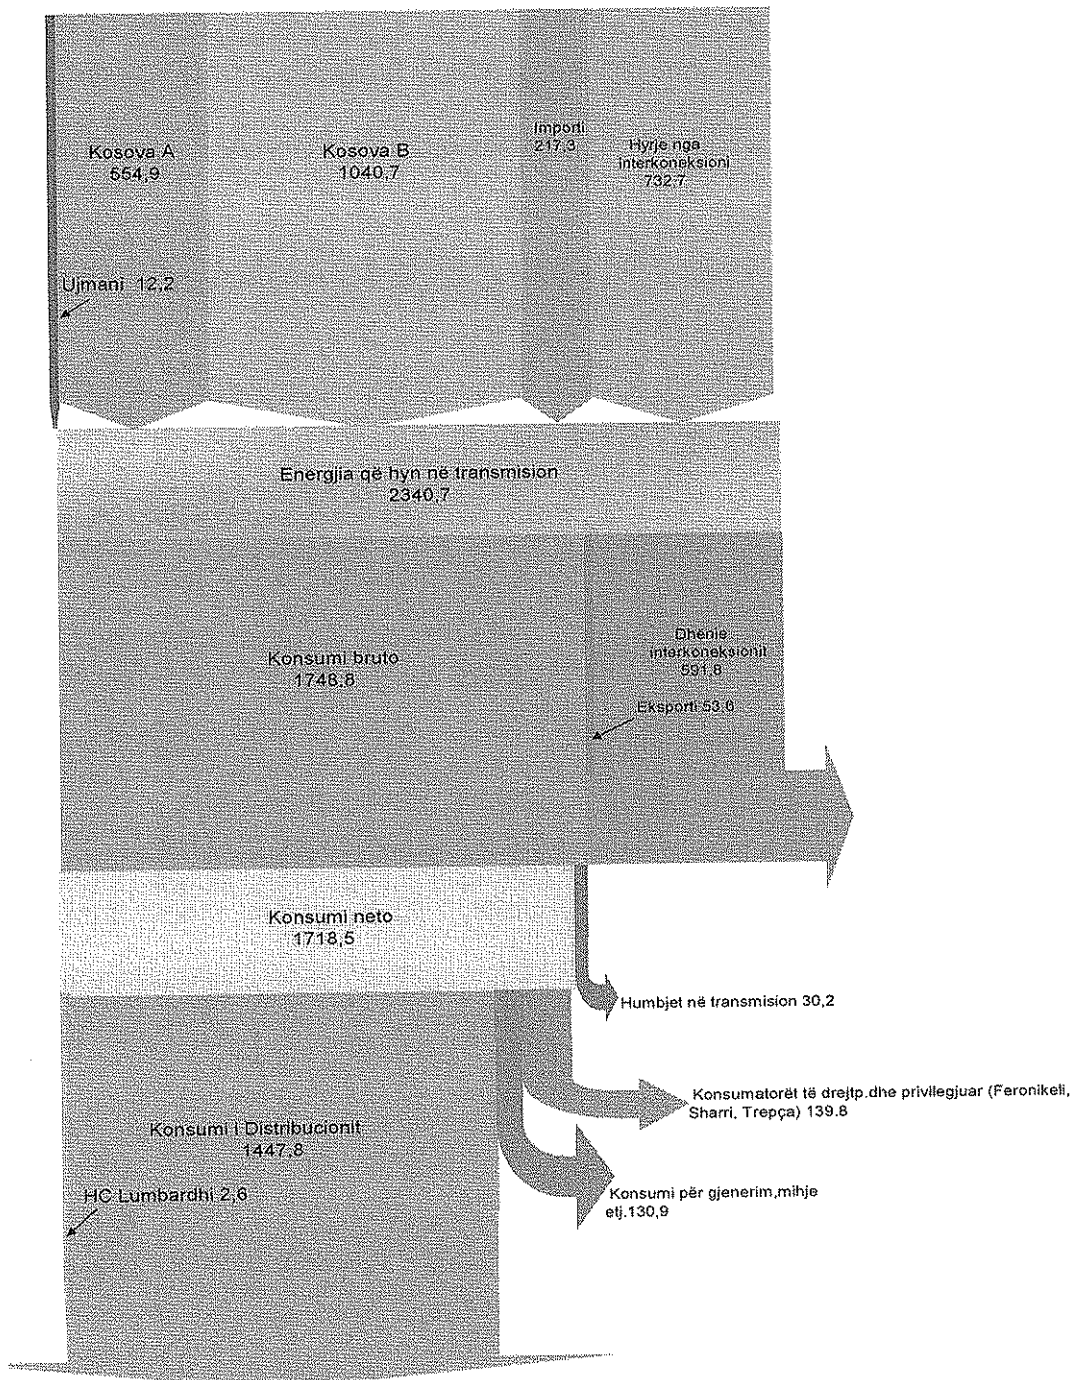

 Departamenti Financiar	RAPORT TREMUJOR		DT-PB-002
	ver. 1.0		faqe 10 nga 42
Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Bucheti			


Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i sistemit

Nr	Indikator	2012		Caku	Komenti
		Janar-Mars 2012	Janar-Mars 2012/2011(%)		
T1	* Energjia që hyn në transmission (GWh)	2405,95	97,29	Nuk mund të vendoset sepse nuk mund të parashihet transiti, e me këte as hyrjet totale në transmission	Caku nuk vendoset për këtë IKP,
T2	Piku koincident (MW)	1109	105,32	Caku: 1100MW (Sipas: Balanca Vjetore e Energjisë Elektrike 2012).	Caku nuk vendoset për këtë IKP, por shihet që 5,32 % ka qenë piku më i lartë në përdhën Janar-Mars 2012 se sa Janar-Mars 2011.
T3	Gjatësia totale e linjave (km)	400 kV	188,49	= > 1	Caku mund të vendoset për çdo vit me ndërtimin e linjave të reja ose riparimin/rindërtimin e linjave të cilat aktualisht nuk janë në operim. Ky cak bazohet në Planin Zhvillimor të Transmisionit.
		220 kV	231,882	103,67	
		110 kV	727,6	100,00	
		400 kV	239450	105,13	
T4	MVA-km	220 kV	77506	= > 1	Caku është si në T3
		110 kV	80573	103,27	
T5	Kapaciteti i transformatorëve	400-220,400-110 kV	1800	= > 1	Ky cak mund të vendoset për çdo vit për instalimin e transformatorëve të ri.
		220-110 kV	1200	100,00	

	RAPORT TREMUJOR		DT-PB-002
	ver. 1.0		<i>faqe 11 nga 42</i>
Departamenti Financiar			
Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti			

T6	Kapaciteti i Disponueshëm Mesatar Import/Eksport(AATC)						I paaplikueshëm për shkak se KOSTT nuk është anëtare e ENTSO-E
T7	Kapaciteti i Disponueshëm Maksimal Import/Eksport MATC						I paaplikueshëm për shkak se KOSTT nuk është anëtare e ENTSO-E
T8	Pagesa për kongjestion						KOSTT do të fillojë pagesën kur ATC (kapaciteti i disponueshëm) do të alokohet nga Operimi i Tregut/kontrollohet nga Operimi i Sistemit, për TTC ¹
T9	Koha mesatare e ndërprerjes (AIT minuta/vit)	25,61	80,94	316,05			AIT (Koha mesatare e rënies) 25,61 minuta gjatë tre muajve, Janar-Mars 2011, ndërsa 80,94 minuta për periudhën e njëjtë 2012. Nuk ka një statistikë për një periudhë më të gjatë që të vendoset caku i vërtetë.
T10	Numri i ankesave për tension	1	0	0,00			Caku për ankesa për tension duhet të ndërlidhet me numrin e ankesave në vitin (et) paraparak në periudhën e njëjtë dhe mundësia e zgjidhjes së ankesës duhet të jetë në kohë sa më të shkurtrë. Gjatë kësaj periudhe, ka pasur një ankesë për tension, nga Ferronikeli.
T11	Ankesat e zgjidhura për tension	Më pak se një javë	0	0,00			Caku për zgjidhjen e ankesave për tension: duhet që në kohë sa më të shkurtrë që të jetë e mundur (< 1 javë) të shqyrtohet ankesa.

¹ TTC –Kapaciteti total që ka të bëjë me vlerën maksimale të programit të shkëmbimeve ndërmjet dy zonave kompatible.


 Departamenti Financiar	RAPORT TREMUJOR		DT-PB-002
	ver. 1.0		<i>faqe 12 nga 42</i>
<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>			

	Më pak se një muaj	Më shumë se një muaj	0	0	0	Nr i përgjigjeve / Nr ankesave = 1	Caku për ankesa të matjeve duhet të ndërlihet me numrin e ankesave për vitin(et) paraprak(e).
T12 Numri i ankesave për matje			0	0		Nr i përgjigjeve / Nr ankesave = 1	Caku për ankesa të matjeve duhet të ndërlihet me numrin e ankesave për vitin(et) paraprak(e).
T13 Ankesat e zgjidhura për matje	Më pak se një javë	Më pak se një muaj	0	0		Nr i përgjigjeve / Nr ankesave = 1	Caku për zgjidhjen e ankesave për matje: duhet që në kohë sa më të shkurtër që të jetë e mundur (< 1 javë) të shqyrtohet ankesa.
T14 Vlera mesatare absolute e devijimeve orare Programi (MWh/orë)	Import		15,75	32,40	205,69	20MWh/h tërheqje jashta programit të deklaruar	Stafi i Qendrës së Kontrollit ka për qëllim që devijimet mesatare absolute në orë të programeve të importeve/eksporteve të jenë sa më të vogla.
	Eksport		16,03	31,88	198,92	20MWh/h shryerje jashta programit të deklaruar	
T15 Humbjet në transmision (GWh)			40,39	30,27	74,95		Humbjet e energjisë elektrike në transmision kanë qenë për 25,05% më të vogla në periudhën Janar-Mars 2012 se sa në periudhën Janar-Mars 2011.

$$AIT = (8760 * 60 * ENS) / TE$$

AIT - Average interruption time - KMR - Koha mesatare e rënieve
 TE - Transmitted energy - ET - Energjia e transmetuar
 ENS - Energy not supplied - EPF - Energjia e pafurnizuar

*)Indikator i T1 Energjia që hyn në transmision (GWh) sipas dokumentit të aprovuar nga ZRrE “Indikatorët e Performancës Teknike”, ka emërtimin Energjia e transmetuar.

	RAPORT TREMUJOR		DT-PB-002	
	ver. 1.0		faqe 13 nga 42	
Sektor: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti				
Departamenti Financiar				

2.1.3. Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i transmisionit

Nr	Indikatorit	Niveli i tensionit		2012		Krahasimi 2012/2011 (%)	Çaku	Kommenti
		2011	2012	Janar-Mars	Janar-Mars			
T1	Numri i prishjeve në linja në 100km gjatësi	KV	400	0.00	0.00	0	< = 1	Performancë negative për shkak të këputjes së përçuesit së LP 184/1 Si në T-9
				0.00	0.00	0		
				0.14	0.14	0		
				0.00	0.00	0		
				0.00	0.00	0		
T2	Koha mesatare e riparimit të prishjes në linjë(orë)	400	0.00	0.00	0	> 1	Performancë negative për shkak të këputjes së përçuesit së LP 184/1 Si në T-9	
			0.00	0.00	0			
			2.21	2.21	0			
			0.00	0.00	0			
T3	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së linjës (minuta)	220	0.00	0.00	0	< = 1	Performancë pozitive	
			0.00	0.00	0			
			0.00	0.00	0			
T4	Numri i prishjeve në transformator në 100 transformator(injësi)	400/220(110)	0.00	0.00	0	< = 1	Performancë pozitive	
			0.00	0.00	0			
T5	Koha mesatare e riparimit të prishjes në transformator(orë)	220/110	0.00	0.00	0	> 1	Performancë negative për shkak të shpërthimit të terçierit të AT2 në NS Prishtina 4	
			0.00	0.00	0			
T6	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së transformatorit (minuta)	400/220(110)	0.00	0.00	0	< = 1	Performancë pozitive	
			0.00	0.00	0			



Departamenti Financiar

RAPORT TREMUJOR


DI-PPB-002

ver. 1.0

faqe 14 nga 42

Sektor: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

T7	Numri i prishjeve në stabilimente të TL në 100 fusha	400	0.00	0.01	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	3.30	0.00	0		
		110	1.20	0.04	3.33		
T8	Koha mesatare e riparimit të prishjes në stabiliment (orë)	400	0.00	4.25	0	> 1	Performancë negative sepse eliminimi i prishjeve ka zgjatur më shumë.
		220	1.00	0.00	0		
		110	2.20	2.762	125.5		
T9	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së stabilimentit(fushës)(minuta)	400	0.00	0.00	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	0.00	0.00	0		
		110	0.00	0.00	0		
T10	Numri i prishjeve në mbrojtje rele/kontroll në 100 fusha	400	0.00	0.00	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	2.77	0.00	0		
		110	0.00	0.00	0		
T11	Koha mesatare e riparimit të prishjes në mbrojtje rele/kontroll (orë)	400	0.00	0.00	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	1.70	0.00	0		
		110	0.00	0.00	0		
T12	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së mbrojtjes rele/kontrollit (minuta)	400	0.00	0.00	0	< = 1	Performancë pozitive
		220	0.00	0.00	0		
		110	0.00	0.00	0		

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 15 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

2.2. Raport mbi operimin e tregut

2.2.1. Madhësia e Tregut

Tregu i energjisë elektrike në Kosovë është treg bilateral ku pjesa më e madhe e tregut është e rregulluar dhe mungon konkurrenca në tregun me shumicë dhe atë me pakicë. Ekziston vetëm një furnizues që furnizon konsumatorët e rregulluar dhe ata të pa rregulluar.

Të drejtën e konsumatorit të kualifikuar e shfrytëzon Feronikeli por meqenëse nuk ka furnizues tjerë të licencuar Feronikeli është furnizuar nga furnizuesi publik me kontratë me çmim të rregulluar. Për shkak të mungesës së konkurrencës dhe furnizuesve të tjerë dhe sipas ligjeve të reja lejohet që konsumatori i kualifikuar të furnizohet nga Furnizuesi Publik me çmim të rregulluar i cili ndryshon nga niveli i tensionit ku ata janë të kyçur. Është arritur marrëveshje midis KEK, Feronikelit dhe ZRrE që Feronikeli të furnizohet nga KEK me çmim të rregulluar në nivelin 220kV. Prandaj madhësia e tregut që i referohet segmentit të rregulluar në nivelin 220kV do të paraqitet në këtë tremujor si raport i energjisë së konsumuar nga konsumatorët e privilegjuar (kualifikuar) në raport me konsumin e përgjithshëm në Kosovë. Kjo përfshinë energjinë e përgjithshme që ka dalë nga transmissioni dhe energjinë që ka hyrë në distribucion nga Lumbardhi, e cila gjithashtu është pjesë e konsumit.

Deri më tani janë realizuar rreth 30% të të hyrave të lejuara të KOSTT por pritet që kjo përqindje të ndryshojë me aplikimin e tarifave të reja.

Si rezultat i kushteve më të favorshme klimatike në këtë kuartal kemi rënie të humbjeve në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2011.

TLF (faktori i humbjeve) mesatare e realizuar në këtë tre-mujor është 1.0176, nga 1.023 sa ishte në të njëjtën periudhë në 2011.

Bilanci i rrjedhave të energjisë në rrjetin transmetues të KOSTT, si shihet mbi 20.74% të rrjedhave fizike të energjisë nëpër rrjetin transmetues, janë tranzit i energjisë për nevoja regionale, dhe për këtë shërbim KOSTT edhe më tutje nga mekanizmi i ITC nuk është duke u kompensuar por kompensohet EMS (TSO e Serbisë).


Sipas estimimeve të KOSTT, energjia elektrike e reduktuar në këtë tre-mujor është mesatarisht rreth 6.14% e konsumit vendor, nga 5.48% sa ishte në periudhën e njëjtë në 2011.

Konsumi tarifor në nivelin me pakicë në këtë tremujor ishte mesatarisht rreth 84.90%.



Portfolio energjetike e palëve në tregun me shumicë është paraqitur në Aneks.


Tregu i rregulluar dhe pa-rregulluar

Energjia që ka hyrë në rrjetin transmetues

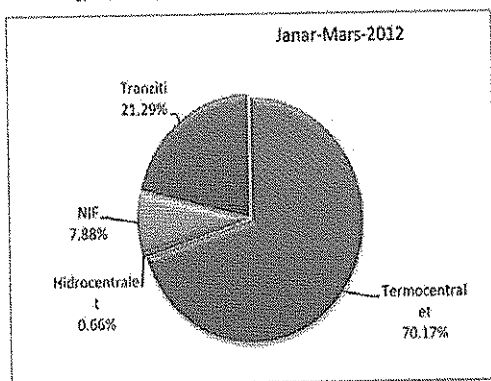

Energjia që ka dalë nga rrjeti transmetues dhe humbjet në transmetim

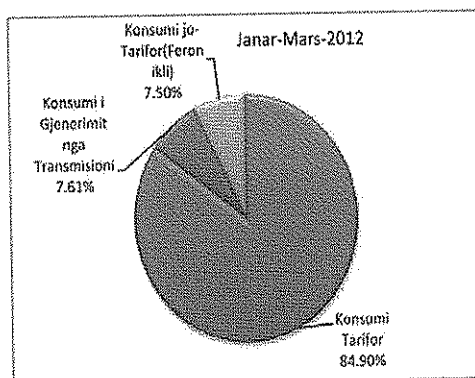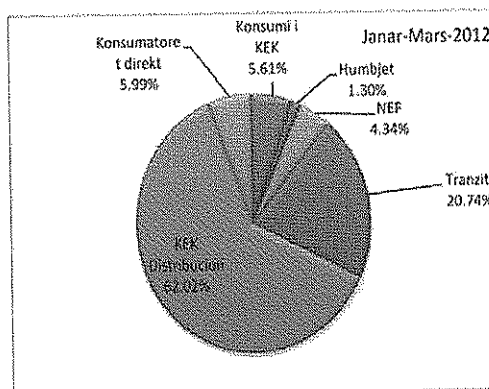

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	ver. 1.0	faqe 17 nga 42
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

2.3. Statusi i investimeve (projekteve) kapitale në KOSTI

Nr	Emri i Projektit	Buxheti	Fincuar nga	Vlera e Kontrates	Data e fillimit	Data e kompletimit	Kontraktues	Realizimi: (i.) Progresi, (ii.) Kreziku dhe pengesat	Rekomandime
1	<i>Paket Projekti Ferizaj-2 LOT-1: NS 400/110 kV Ferizaj 2</i>	15,800,000.00 €	BKK	13,656,000.00 €	24.12.2009	23.10.2012	SIEMENS (A)	(i.) Projekti është në fazën e periudhës garantuese njëvjeçare.	
	<i>Paket Projekti Ferizaj-2 LOT-2: LP ndërlybëse 400 dhe 110 kV</i>	7,500,000.00 €	ECL	6,105,000.00 €	31.12.2009	30.10.2011	UMEL (B&H)	(i.) Projekti është në fazën e periudhës garantuese njëvjeçare.	



Departamenti Financiar

RAPORTI TREMUJOR

ver. 1.0

DT-PB-002

fajqe 18 nga 42

Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

2	<p><i>Paket Projekti SCADA/EMS dhe Telekomi LOT- I:SCADA/EMS</i></p>	8,500,000.00 €	BKK	7,875,370.00 €	31.12.2008	30.06.2011	Alstom/Komtel (F/RKS)	<p>(i.) Sipas planit dinamik projekti është lëshuar në punë me 30.06.2011, por jo i kompletuar. Ka përfunduar periudha e Disponueshmërisë së Sistemit. Është nënshkruar dhe lëshuar Certifikata e Pranimit Parcial të Përkohshëm (PPAC), më 04.11.2011, me ç'rast fillon edhe periudha garantuese njëvjeçare, për ato pjesë të projektit. Gjatë kësaj periudhe kontraktuesi është anagzhuar në eliminimin e vërejtjeve nga lista e raportit të komisionit për pranim teknik intern të KOSTT-it. Me date 29.03.2012 dhe 30.03.2012, Komisioni për Pranim Teknik Intern i KOSTT-it, ka dalur për komisionimin e eliminimit të vërejtjeve me ç'rast ka përgatitur raportin përkatës.</p>	<p>Të gjitha vërejtjet e paraqitura gjatë SAT -testimeve dhe vërejtjet që janë paraqitur nga komisioni për pranim teknik intern, duhet të eliminohen brenda afatit të paraparë.</p>
	<p><i>Paket Projekti SCADA/EMS dhe Telekomi LOT-2: Telekomi</i></p>	9,500,000.00 €	BKK	9,214,760.00 €	31.12.2008	30.06.2011	Energoinvest/Alstom(B&H/F)	<p>(i.) Sipas planit dinamik projekti është pjesërisht i përfunduar dhe me 30.06.2011 sistemi SCADA/EMS dhe telekomi . Është nënshkruar deklarata për kompletimin e projektit nga ana e ALSTOM dhe KOMTEL për përfundimin e punimeve të projektit. Ka përfunduar periudha e Disponueshmërisë së Sistemit . Certifikata e Pranimit të Përkohshëm (parcial) PPAC lëshohet për pjesët e përfunduara , me ç'rast fillon edhe periudha garantuese njëvjeçare, për ato pjesë të projektit. Gjatë kësaj periudhe kontraktuesi duhet të vazhdoj me përfundim të punëve konform kontratës dhe në eliminimin e vërejtjeve nga lista e raportit të komisionit për pranim teknik intern të KOSTT-it. Me date 29.03.2012 dhe 30.03.2012, prape Komisioni për Pranim Teknik Intern i KOSTT-it, ka dalur për komisionimin e eliminimit të vërejtjeve me ç'rast ka përgatitur raportin përkatës.</p>	<p>Të gjitha vërejtjet e paraqitura gjatë SAT -testimeve dhe vërejtjet që do të paraqiten nga komisioni intern duhet të eliminohen brenda afatit garantues.</p>



Departamenti Financiar

RAPORT TREMUJOR

DI-PB-002

ver. 1.0

faqe 19 nga 42

Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

3	<p>Ndërrimi i Pajisjeve të Tensionit të Lartë në NS Prizreni 2 dhe Instalimi i ATR3, 150 MVA (LOT1)</p>	10.000.000,00	ECHO	6,308,920.00 €	10.01.2011	09.07.2012	KONCAR (H)	<p>(i) Projekti është në fazën e implementimit. Qarqet sekondare për 5 fusha (3 110 kV si dhe 2 220 kV) janë të gatshme për lidhje në ormanët e mbrojtjes dhe sistmit komandues dhe monitorues të nënstationit (obligim i kontraktuesit: konsorciumit Alstom/Komtel PE në kuadër të Projektit SCADA/EMS dhe Telekom). Disa herë janë mbajtur takime teknike koordinuese me të dy kontraktuesit Koncar dhe Alstom/Komtel, por edhe me date 05.04.2012, me ç'rast të dy kontraktuesve iu bë e qartë se projekti duhet kompletuar në kohë, si dhe u njoftuan për "milestone" në projekt. (ii) Ka vonesa në projekt, dhe shkaktar i këtyre vonesave është mosperformimi si duhet i kontraktuesit gjatë implementimit të projektit si dhe kushtet e vështira të motit gjatë sezonës dimërore. Kontraktuesi ka paraqitur planin e ri dinamik me vonesë prej dy muajsh (62 dite). Përveç kësaj, mund të ketë vonesa tjera, varësisht se sa është i gatshëm me staf kontraktuesi Alstom/Komtel PE të bëjë lidhjet e qarqeve sekondare, sipas planit dinamik të dërguar nga Koncar. Për planin dinamik të ketij projekti kontraktuesi i SCADA/EMS (Alstom/Komtel PE) ka qenë i njoftuar me kohë nga ana e KOSTT-it.</p>	<p>Kontraktuesit Koncar, në menyrë që të arrijë kohën e kompletimit të projektit, i është kërkuar të rris numrin e stafit profesional si dhe makinerinë që do të punojë në terren.</p>
4	<p>Ndërrimi i përçuesit, izolatorëve dhe pajisjeve lidbëse në LP 125/2 dhe 125/3</p>	2,389,000.00 €	KOSTT	1.959.800.80€	01.06.2011	20.12.2011	ELSA&UKAB (S/RKS)	<p>(i). Është vazhduar me demontimin e shryllave të vjetra, mirëpo pasi që ende nuk kemi marr përqimin (lejen) nga Ministria e Ambientit dhe e Mjedisit, kemi kërkuar nga kontraktuesi që të ndalet me implementimin e projektit. Duhet theksuar se kontraktuesi ende nuk e ka sjellë dizajnin/projektin për linjën 110 kV Trepçe-Vallaq, konform Ligjit për Ndërtim dhe Elaboratit e Shpronësimit, konform Ligjit për Shpronësim.</p>	<p>Është kërkuar nga kontraktuesi që dokumentacioni i kërkuar/dizajni të jetë plotësisht sipas kërkesave të KOSTT-it, konform Ligjit për Ndërtim dhe Ligjit mbi Shpronësimet.</p>



RAPORT TREMUJOR

DT-PB-002

ver. 1.0

faqe 20 nga 42

Departamenti Financiar

Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

5	Kycja e NS Lipjanit në linjën LP 212 (Kosova A - Ferizaj 2)	1,050,000.00 €	KOSTT	1,397,094.32 €	27.06.2011	27.07.2012	UMEL (B&H)	(ii.) Projekti ka vonesa në implementim, për shkak se kontraktuesi nuk është duke performuar si duhet në raport me dizajnet/projektet që nevojiten për marrjen e Lejes Urbanistike dhe Ndërtimore sipas kërkesës së Ministrisë së Planifikimit Hapsinor. Për këto vonesa kontraktuesi është njoftuar zyrtarisht dhe i është tërhequr vërejtja se për vonesat që janë shkaktuar nga ai, do të veprojmë konform kushteve të kontratës. (i). Është dërguar dokumentacioni për marrjen e lejes nga Ministria e Ambientit dhe të Mjedisit, pritet që kur të mirret leja të fillohet me implementimin e projektit. Në ndërkohë është bërë demontimi i disa paisjeve të vjetra nga NS Lipjani - 110/35 kV. (ii). Projekti ka vonesa në implementim, si pasojë e mospërgatitjes siç duhet të dizajnet nga ana e kontraktuesit sipas regjimit të ri që Ministria e planifikimit hapsinor kërkon, konform Ligjit për Ndërtim dhe atë të Shpronësimeve. Ende nuk është siguruar Leja Urbanistike dhe ajo Ndërtimore për këto objekte.	Është kërkuar nga kontraktuesi që dokumentacioni i kërkuar/dizajni të jetë plotësisht sipas kërkesave të KOSTT-it, konform Ligjit për Ndërtim dhe Ligjit mbi Shpronësimet.
6	Ndërrimi i Mbrojtjeve Rele në NS 110/35kV Prishtina 2 dhe Prishtina 3	250,000.00 €	KOSTT	168,880.32 €	11.07.2011	02.01.2012	KONCAR-KET (HP)	(i). Projekti është kompletuar dhe është bërë Pranimi Teknik Intern. (ii.) Projekti ka pasur vonesa, si pasojë e mossigurimit të kushteve për punë nga ana e Operimit të Sistemit.	



Departamenti Financiar

RAPORT TREMUJOR

ver. 1.0

Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

DT-PB-002

fajqe 21 nga 42

7	Rehabilitimi në linjat 110kV, 126/4 (pjesa e vjetër), 179/1, 1801 (ndërrimi i izolatorëve dhe urave përçuese)	150,000.00 €	KOSTT	51,976.60 €	25.09.2011	29.06.2012 (120 ditë punë)	27.01.2012	ELEGANCA (RKS)	UKab (RKS)	(i) Kanë përfunduar punët implementuese në Linjën 110kV, nr.1801, në linjën 179/1 kanë përfunduar punët pjesërisht 80%, në linjën 126/4 nuk kanë filluar punët akoma për shkak të pa mundësisë së krijimit të kushteve për punë për kontraktuesin; (ii.) Ka vonesa në projekt si pasojë e pamundësisës së krijimit të kushteve për punë - shkyçjet e linjave.	Është kërkuar nga Departamenti i Operimit të Sistemit për gjetjen e kohës së përshatshme për krijimin e kushteve për punë për kontraktuesin.
8	Ndarja e zbarrave në dy seksionë në NS Gjilani 1 dhe NS Tberande	150,000.00 €	KOSTT	36,951.57 €	09.08.2011			UKab (RKS)		(i) Projekti është në fazën e implementimit. FAT (Pranimi Teknik në Fabrikë) është bërë për ndarës si dhe liferimi i tyre do të ndodh shumë shpejt. (ii.) Ka vonesa në projekt për shkak të moskrijimit të kushteve për punë kontraktuesit - shkyçjet totale të stabilimenteve gjatë sezonës dimërore dhe tash për NS Gjilani 1 dhe NS Tberandë	Është kërkuar nga Departamenti i Operimit të Sistemit për gjetjen e kohës së përshatshme për krijimin e kushteve për punë për kontraktuesin.
9	Rialokimi i linjës 110kV, nr.1806 NS Gjakova 1 - Gjakova 2 dhe Rehabilitimi i pajisjeve të TL në NS Gjakova 1	4,000,000.00 €	KOSTT	3,267,253.00 €	02.12.2011			UKab (RKS)/ELSA (si)		(i) Projekti është ende në fazën fillestare; ende nuk janë dërguar dizajnet bazike dhe ato detale, që janë parakusht për sigurimin e Lejes Urbanistike dhe Ndërrimore për ndërtimin e linjës së dyfishtë 110 kV si dhe të zgjerimit të nënstacionit NS Gjakova 1. Është realizuar FAT (Pranimi Teknik në Fabrikë) për pajisjet: ndarës, ndërprerës të fuqisë dhe transformatorë matës. Liferim i tyre është bërë. (ii.) Projekti ka vonesa të konsiderueshme në dorëzimin e dizajneve mbi bazën e të cilave do të zhvilloheshin aktivitetet administrative për lejet e ndërtimit dhe shpronësimeve, të shaktuara nga ana e kontraktuesit, si pasojë e mosperformancës sipas kushteve të kontratës. Tek me date 18.04.2012 është dërguar plani i ri dinamik i realizimit të projektit; ku shihet vonesa e projektit; kompletimi i projektit deri në fund të Dhjetorit 2012. Procesverbali i miratuar nga BD në takimin e dt.30.04.2012 detajisht sqaron veprimet e mëtejme.	Kontraktuesit i është kërkuar disa herë zyrtarisht që t'i përmbahet kushteve kontraktuale, po ende nuk ka ndonjë rezultat në këtë drejtim. Për situatën e tillë të krijuar është njoftuar edhe Departamenti i Prokurimit dhe menaxhmenti me i lartë. Është kërkuar nga kontraktuesi që dokumentacioni i kërkuar/dizajni të jetë plotësisht sipas kërkesave të KOSTT-it, konform Ligjit për Ndërtim dhe Ligjit mbi Shpronësimet.



Departamenti Financiar

RAPORT TREMUJOR


ver. 1.0

Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti


DT-PB-002

fajde 22 nga 42

10	Rehabilitimi i pajisjeve për shpenzime vetjake në NS 400/220kV - Kosova B	250,000.00 €	KOSTT	272,409.00 €	12.12.2011	(150 ditë)	Monting (RKS)	(i) Projekti është në fazën e implementimit. Dizajnet bazike dhe detale janë duke u kompletuar/aprovuar nga ana e KOSTT-it. Është mbajtur FAT (Pranimi Teknik në Fabrikë) për kthinat 6.3 kV. Liferimi i tyre do të ndodh shumë shpejt.	Është kërkuar nga kontraktuesi që dokumentacioni i kërkuar/dizajni të jetë plotësisht sipas kërkesave të KOSTT-it, konform Ligjit për Ndërrim dhe Ligjit mbi Shpronësimit.
11	Rehabilitimi i pajisjeve të tenisonit te larte (TL) 110kV në NS Gjilani 1 dhe NS Ferizaji 1	1,150,000.00 €	KOSTT	960,031.00 €	18.02.2012	17.12.2012	Enbi-Power (All)	(i) Projekti është në fazën e implementimit. Janë duke u komentuar/aprovuar dizajnet bazike dhe detale për pajisjet që do të ndërrohen.	
12	Instalimi i dy fushave te reja te linjave 110kV në NS Prizreni 2	600,000.00 €	KOSTT	551,998.00 €	17.02.2012	03.08.2012	Ukab (RKS)	(i) Projekti është në fazën e implementimit. Janë duke u komentuar/aprovuar dizajnet bazike dhe detale për pajisjet që do të ndërrohen.	
13	Rehabilitimi i stabilimenteve te TL në NS Gjakova 2	1,400,000.00 €	KOSTT	0 €				(i). Projekti është në fazën e përgatitjes. Deri në fund të Prillit 2012 pritet të dorëzohen termat e referencës dhe Specifikimet Teknike në Departamentin e Prokurimit për procesin e tenderimit	
14	Rehabilitimi i stabilimenteve te TL në NS Prizreni 3	1,400,000.00 €	KOSTT	0 €				(i). Projekti është në fazën e përgatitjes. Deri në fund të Prillit 2012 pritet të dorëzohen termat e referencës dhe Specifikimet Teknike në Departamentin e Prokurimit për procesin e tenderimit	

	RAPORTI TREMUJOR	DT-PB-002
	ver. 1.0	faqe 23 nga 42
Departamenti Financiar		
Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti		

15	<i>Furnizimi me softuerin E-Plan</i>	20,000.00 €	KOSTT					<p>(i). Termat e Referencës dhe Specifikimet Teknike janë përgatitur me kohë dhe janë dorëzuar në Departamentin e Prokurimit me 23.01.2012, për procesin e tenderimit. Projekti është anuluar. Njoftimi për Anulim është bërë për shkak se të gjitha ofertat kanë tejkaluar subsancialisht buxhetin.</p>	
16	<i>Asfaltimi i rruges se çasjes për në NS 400/110 kV - Peja 3</i>	150,000.00 €	KOSTT					<p>(i). Termat e Referencës dhe Specifikimet Teknike janë përgatitur me kohë dhe janë dorëzuar në Departamentin e Prokurimit me 31.01.2012, për procesin e tenderimit. Për këtë projekt është përzgjedhur fituesi dhe është shpallur Njoftimi mbi dhënien. Nënshkrimi i kontratës (nëse nuk do të ketë ankesa), pritet të bëhet me datën 28.05.2012.</p>	
17	<i>Ndërtimi i rretbojes se re në NS 400/220 kV - Kosova B dhe Instalimi i ndriçimit për gjatë saj</i>	180,000.00 €	KOSTT					<p>(i). Termat e Referencës dhe Specifikimet Teknike janë përgatitur me kohë dhe janë dorëzuar në Departamentin e Prokurimit me 22.03.2012, për procesin e tenderimit. Projekti është në pritje, (nuk është publikuar) për arsye se buxheti i paraparë nuk është i mjaftueshëm në bazë të kërkesave të specifikimit teknik.</p>	
18	<i>Instalimi i kamerave vëzhguese (CCTV) në NS Kosova B dhe Depo</i>	100,000.00 €	KOSTT					<p>(i). Projekti është në fazën e përgatitjes. Deri në fund të Prillit 2012 pritet të dorëzohen termat e referencës dhe Specifikimet Teknike në Departamentin e Prokurimit për procesin e tenderimit</p>	

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 24 nga 42</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

2.4. Çështjet rregullative

Shqyrtimi i Gjashtë i Tarifave të Energjisë Elektrike (SHTE6)

Në fillim të muajit janar KOSTT ka pranuar nga ZRRE njoftimin për planet e ZRrE lidhur me procesin e shqyrtimit të tarifave të energjisë elektrike (SHTE6) të cilat pritet të hyjnë në fuqi nga data 1 prill 2012. Procesi i shqyrtimit të tarifave përfshinë përcaktimin e të Hyrave Maksimale të Lejuara (MAR) që të licencuarit në shqyrtim i lejohet të mbledhë për shërbimet e rregulluara që ofron. MAR-i i përcaktuar me këtë shqyrtim pritet të hyjë në fuqi që nga data 1 prilli 2012.

Sipas planit të pranuar nga ZRrE, me datë 17 janar KOSTT ka dorëzuar aplikacionin për të hyrat e lejuara për periudhën duke filluar nga data 1 prill 2012. Në ditët në vijim kanë vazhduar konsultimet/takimet si dhe disa plotësime dhe sqarime shtesë lidhur me aplikacionin.


Me datë 27 shkurt kemi pranuar Raportet Konsultative të Zyrës së Rregullatorit për Energji, lidhur me aplikacionet e Korporatës Energjetike të Kosovës sh.a. (KEK) dhe të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe të Tregut të Kosovës sh.a. (KOSTT). Këto Raporte kanë për qëllim të pranimit të komenteve nga KOSTT dhe KEK si dhe nga palët e interesit për vlerësimet e ZRrE-së. Raporti përmban edhe propozimet preliminare për të Hyrat e Lejuara për KEK-un dhe KOSTT-in, të cilat do të shërbejnë si bazë për përcaktimin e tarifave.

KOSTT ka analizuar Raportin Konsultativ për KOSTT dhe për KEK dhe i ka përgatitur komentet.. Me datë 12 shkurt janë dërguar në ZRrE komente ndaj Raportit Konsultativ për KOSTT dhe ndaj Raportit Konsultativ për KEK..

Vendimi i ZRrE lidhur me kontestin e ngritur nga KOSTT sh.a. ndaj KEK sh.a.

Me datë 28 shkurt 2012, KOSTT ka pranuar nga ZRrE vendimin V_400 të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji, nga mbledhja e mbajtur me datë 29 dhjetor 2011, lidhur me kontestin e ngritur nga KOSTT sh.a. ndaj KEK sh.a. lidhur me çështjet : refuzimi i pagesës për shërbimet e transmisionit dhe kthimi i faturave për muajin nëntor dhe dhjetor të vitit 2010, mospagesën e faturave të bashkërenditjes për vitin 2008 dhe 2009 dhe mosnënshtrimin e Marrëveshjeve të Kycjes KOSTT – KEK për kycjet ekzistuese.

Në bazë të njoftimit të lëshuar nga ZRrE për fillimin e procesit për modifikimin e Licencave në përputhje me kërkesat e reja të përcaktuara me Legjislacionin e ri në

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 25 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>


Kosovë, KOSTT ka përgatitur komente dhe i ka dërguar në ZRrE me date 07 mars 2012.

Me datë 29.02.2012, KEK sh.a. përmes të shkresës përcjellëse ka kthyer faturat për muajin tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit 2011.

Me datë 12 mars KOSTT ka njoftuar ZRrE-në lidhur me shkresën e KEK-ut t datës 29.02.2012 për kthimin e faturave për muajin tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit 2011.

Me datë 28 shkurt 2012, KOSTT ka iniciuar pranë ZRrE-së kontestin kundër KEK Sh.a për mospagesat e vitit 2011.


Në bazë të dispozitave të Ligjit për Energji Elektrike KOSTT pa përgatitur dhe ka dërguar në ZRrE drafte e parë të Metodologjive Tarifore për Shfrytëzimin e Sistemit të Transmisionit.

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 26 nga 42</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

2.5. Shqyrtimi i performancës financiare

2.5.1. Draft Pasqyrat Financiare: BILANCI I GJENDJES


	Janar-Mars /2011	Janar-Mars /2012	%
ASETETE JO QARKULLUESE	87,487,319	110,216,882	125.98%
Prona, Fabrika dhe Paisjet	68,695,319	108,759,783	158.32%
Investimet ne vijim	18,792,000	1,457,099	7.75%
ASETET QARKULLUESE	35,803,047	31,273,005	87.35%
Stoqet, pjesët rezervë dhe veglat	916,337	1,565,666	170.86%
Kërkesat	10,032,777	10,736,880	107.02%
Kredi, avanse dhe depozita	6,890,671	1,289,139	18.71%
Tatimi i parapaguar	135,417	206,195	0.00%
Paraja dhe Bilanci Bankar	17,827,846	17,475,125	98.02%
TOTALI I MJETEVE	123,290,366	141,489,887	114.76%
KAPITALI I AKSIONARËVE	45,350,999	54,164,434	119.43%
Kapitali Aksionar	25,000	25,000	100.00%
Kapitali i trashëguar	28,346,963	38,176,268	134.67%
Fitimi i mbajtur	14,679,099	15,367,648	104.69%
			0.00%
Fitimi aktual	2,299,937	595,518	25.89%
OBLIGIMET JO QARKULLUESE	69,266,636	75,713,931	109.31%
Të hyrat e shtyera	69,266,636	75,713,931	109.31%
OBLIGIMET QARKULLUESE	8,672,731	11,611,522	133.89%
Obl.nga tregtia dhe obl.tjera	8,672,731	11,611,522	133.89%
TOTAL BURIMET E MJETEVE	123,290,366	141,489,887	114.76%

	RAPORT TREMUJOR		DT-PB-002
	ver. 1.0		faqe 27 nga 42
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti	

DRAFT PASQYRA E FITIMIT DHE HUMBJES

Nota	Plani Janar-Mars 2011	Realiz. Janar-Mars 2011	% real/plani 2011	Plani Janar-Mars 2012	Realiz. Janar-Mars 2012	% real/plani 2012	% realiz 2012/2011
15	5,136,087	5,311,924	103.4%	3,454,928	3,521,787	101.9%	66.3%
16	730,000	1,004,848	137.7%	1,237,500	1,325,798	107.1%	131.9%
	5,866,087	6,316,771	107.7%	4,692,428	4,847,585	103.3%	76.7%
17	667,838	637,186	95.4%	798,021	742,138	93.0%	116.5%
	13,000	7,940	61.1%	13,000	9,476	72.9%	119.3%
	11,250	35,765	317.9%	11,250	10,219	90.8%	28.6%
4	1,560,000	1,661,038	106.5%	1,475,000	2,102,645	142.6%	126.6%
	57,195	69,840	122.1%	69,695	78,653	112.9%	112.6%
18	188,129	54,708	29.1%	327,000	165,047	50.5%	301.7%
	23,301	18,863	81.0%	25,500	20,264	79.5%	107.4%
20	78,000	76,053	97.5%	77,500	33,179	42.8%	43.6%
19	300,061	86,696	28.9%	311,320	177,406	57.0%	204.6%
	13,750	7,603	55.3%	13,750	16,989	123.6%	223.4%
21	1,265,233	1,361,143	107.6%	1,291,243	896,051	69.4%	65.8%
	400,000			400,000		0.0%	
	4,577,756	4,016,834	87.7%	4,813,279	4,252,067	88.3%	105.9%
	1,288,331	2,299,938		(120,851)	595,518		
22							
	1,288,331	2,299,938		(120,851)	595,518		


Shpjegim: Nëse KOSTT nuk do të kishte pasur të hyra tjera pos KEK-ut, atëherë kishte me qenë në humbje për 700 mijë.€

 Departamenti Financiar	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	ver. 1.0	faqe 28 nga 42
Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti		


2.5.2. Analiza e IKP-ve financiare

IKP-të financiare të zgjedhura për të paraqitur performancën financiare të KOSTT-it, janë të matshëm në baza vjetore dhe në baza kuartale. Indikatorët e paraqitur në këtë tabelë janë të matshëm në baza kuartale.

Treguesit	I-III 2014	I-III 2012	Spjegimet
T1. Fitimi operativ marginal = Fitimi nëto / gjithësejt të hyrat	0.4	0.1	<p>Qëllimi është që të jetë mbi zero.</p> <p>Është treguesi i cili më së miri paraqet nivelin e të hyrave nga operacionët vijuese.</p> <p>Ky tregues matë se çfarë përqindje e të hyrave të kompanisë, mbetet pasi që ajo t'i paguaj të gjitha shpenzimet variabile si: pagat, materialet, shërbimet, etj.</p> <p>Sa më i lartë është ky tregues, kompania është në gjendje më të mirë.</p>
T2. Treguesi i qarkullimit = asetet qarkulluese/detyrimet qarkulluese	4.1	2.7	<p>Tregon aftësinë e kompanisë për t'i përmbushur obligimet e saj afatshkurtera, me mjetet (asetet) e saj afatshkurtera. Optimalja e këtij treguesi është 1.5.</p>
T4. Mbulimi i shp.operative = gjith.të hyrat/ shpenzimet operative	1.6	1.1	<p>Tregon raportin e të hyrave dhe shpenzimeve operative të realizuara. Treguesi duhet të jetë më i madh ose = 1</p>
T5. Mbulimi i të hyrave = gjith.të hyrat/ shpenzimet e lejuara	1.7	1.0	<p>Treguesi duhet të jetë më i madh ose = 1</p>

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	ver. 1.0	faqe 29 nga 42
Departamenti Financiar		
Sektori: Planifikimi, Strategjike dhe Buxheti		

T6. Mbulimi i shp. të lejuara = shpenzimet e lejuara/gjithësejt të hyrat	0.6	1.0	Treguesi duhet të jetë më i vogël se 1 ose = 1
T7. Gjith. të hyrat ndaj të hyr. të lej = gjith. të hyrat e rregulluara/të hyrat e lejuara	1.2	1.0	Këtu vihen në raport vetëm të hyrat e rregulluara të realizuara dhe të hyrat e lejuara. Treguesi duhet të jetë = 1.
T12. Shpenzimet e lejuara për GWh e transmetuara	2.1	2.8	Ky indikator ndërlidhet me metodologjinë e tarifave të ZRRtE-së, e cila për periudhën raportuese ka lejuar shpenzimet totale për njësi 2.8 m €/GWh. Ky indikator tutje analizohet duke iu referuar treguesit T14, që paraqet shpenzimet totale (të realizuara) për njësi, ku shihet se KOSTT ka transmetuar energji me shpenzimet reale 2.5 m €/GWh.
T13. Të hyrat e lejuara për GWh e transmetuara	3.1	2.7	Paraqet të hyrat për njësi. Objekti: Efikasiteti në terma relative të shpenzimeve që i referohen humbjeve teknike
T14. Shpenzimet totale për njësi = shp. totale/GWh e transmetuara	2.3	2.5	Objekti: Efikasiteti në terma relative të shpenzimeve që i referohen humbjeve teknike

	RAPORTI TREMUJOR	DT-PB-002
	ver. 1.0	faqe 30 nga 42
Departamenti Financiar		
Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti		

3. Përmbledhja dhe përshkrimi i procedurave gjyqësore

Nr	Lënda nr.	Pranë	Objekti i kontestit	Vlera e kontestit	Statusi	Statusi
1	Lënda Civile nr. 2248/03	Gjykata Komunale në Prishtinë	dëmshpërblim për lëndim në vendin e punës	92,000.00	Seanca me dt.23.03.2009. KOSTT ka kërkuar që lënda të dërgohet KEK-ut për shkak të kompetencës	Seanca e caktuar për dt.14.07.2009, u mbajt me vonësë, KOSTT ia ka dorëzuar Përgjigjen në Padi Gjykatës dhe në seancë në tërësi hedh poshtë kërkesëpadinë e Paditësit si të pabazë.Pritet Akgjykimi.
2	Lënda penale nr.326/05	Gjykata Komunale në Kaçanik	vjedhje	2,370.00	Seanca e rradhës u caktua për datën 18.11.2008; shtryhet 30.01; shtryhet 30.03.2009	Seanca përfundimtare me dt.17.03/09, është mbajtur Akrgjykimi.- është pranuar, Lënda me Ankesë nga Prokurori të dt.08.04.2009)
3	Lënda Civile nr.85/05	Gjykata Komunale në Prishtinë	kompensim i dëmit	50,000.00	Seanca e rradhës është caktuar për datën 24.12.2008	Seanca përfundimtare me dt.17.03/09, është mbajtur Akrgjykimi.- është pranuar, Lënda me Ankesë nga Prokurori të dt.08.04.2009)



RAPORT TREMUJOR

DT-PB-002

faqe 31 nga 42

ver. 1.0


Departamenti Financiar

Sektor: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti

Lënda civile	Gjykata	pagesa e kamatës ligjore	nuk ka	Përfaqësuesi i KEK-ut, ka refuzuar pjesëmarrjen në seanca pa prezencën e KOSTT-it.	Është caktuar seanca me dt.01.04.2009, shtyhet. KOSTT parashtron Ankesë ne GjQ-Pr, kundër Aktgjykimit C1 505/07. Seanca e rradhës, dt.06.05.2010.	Aktgjykimi nuk është i formës së prerë
Lënda penale nr. 2406/06	Gjykata Komonale në Prishtinë	vjedhje	15,398.00	Aktgjykimi në favor të KOSTT-it por nuk është bërë akoma i plotfuqishëm	Nuk kemi njoftim ende për formën e prerë.	Verifikim me dt.11.06/09, Aktgjykimi nuk i është dorëzuar të Paditurve, nga dt.12.06, do t'i dorëzohet me polici
Lënda penale nr.320/06	Gjykata Komonale në Kaçanik	vjedhje e rëndë	9,120.00	Seanca e rradhës është caktuar për datën 14.11.2008	Seanca e caktuar për dt.27.01.2009 është mbajtur dhe pritet Aktgjykimi	Aktgjykimi me Ankesë, ne GjQ, nga dt.19.03/09 Verifikimi i fundit 29.06.2010.
Lënda penale 284/06	Gjykata Komonale në Lipjan	vjedhje e rëndë	Nuk është përcaktuar	KOSTT ka ushtruar Ankesën për zgjedhje të pjesërishtme (vlera e kontesit)		Lënda me Ankesë, pritet përgjigja nga Gjykata e Qarkut.
Lënda civile nr. 409/06	Gjykata Komonale në Prishtinë	Lirimi i banesës	nuk ka	Seanca e rradhës nuk është mbajtur, pritet caktimi i seancës tjetër	Seanca e caktuar gabimisht nga Gjykata me dt.04.01/10 (ditë pushimi).	Seanca e rradhës nuk është caktuar ende.


9	Lënda civile nr.511/00	Gjykata Komunale në Prishtinë	lirimi i lokaleve në Kurriz	nuk ka	Kontesti ka përfunduar pozitivisht për KOSTT-in. Pritet Akgjykimi i Gjykatës Komonale në Prishtinë	Akgjykimi është marrë, në proces është propozimi për ekzekutim.	Ende nuk është kryer. (Paraprakisht marrëveshja me palët për lirim të Lokaleve). Lënda meAnkesë GjQPr. KOSTT, ka parashtrua Urgjencë GJQarkut-PR.
10	Lënda civile nr. 2168/04	Gjykata Komonale në Prishtinë	lirimi i lokalit nga gjelëtorja në Kurriz	nuk ka	Seanca e rradhës u caktua për datën 19.11.2008	Dalja në vend me Gjykatën, dt.23.04/09, pritet Raporti i Ekspertit.	Seanca e rradhës me dt.17.04/09, (Përfaqëson KEK-u). Pengohet puna e Ekspertit nga Pala. Njoftohet Gjykata. KOSTT parashtron Urgjencë në vazhdimin e çështjes GjK-Pr.
11	Lënda civile C.nr.588/08	Gjykata Komonale në Gjakovë	Kompenzim dëmi	10000	Seanca u caktua për dt.19.01.2009	Seanca e rradhës në afat të pacaktuar	KOSTT, sipas Aktvendimit C.nr.136/09 paraqet përgjigje në Padi, me dt.28.04.2009.Në precizim të Padisë KOSTT dt.27.03.2012, parashtron përgjigje në Padi të C.nr.588/08
12	C.156/09	Gjykata Komonale Prizren	Kompenzim dëmi		I parashtruar me dt.11.03/09.		Pritet caktimi i seancës së radhës.
13	Lëndë civile, Padi	Gjykata Komonale Ferizaj	kompenzimi i dëmit	200,00€	Padia e dorëzuar në Gjykatë ,26.06/09	Pritet caktimi i seancës.	Pritet caktimi i seancës.

14	C.nr.1559/06	Gjykata Komunale Prishtinë	pagesa e Rentës.		KEK ka paguar - Qershor/2006.	Seanca e 06.05; 04.06, 08.07 dhe shryhet 26.10/10	KOSTT ka dhënë dëshminë mbi legjitimitet pasiv.
15	C.nr. 270/07	Gjykata Komunale Podujevë	Kompenzim dami	100.000,€	KOSTT- I padituri III-të (Tretë)	seancat e dt:10.09; dhe 12.10/10 dorzimi i shkresave të lëndës KOSTT-it	Seanca e radhës sipas ftesës.
16	C.nr.218/11	Gjykata Komunale Ferizaj	Pengim Posedi	500 €	KOSTT- ka parashtrua Përgjigje në Padi sipas Aktvendimit të Gjykatës	Seanca e dt. 20.06/11, shryhet me 04.07; shryhet me 05.09/11.Seanca e radhës dt.27.10/11	Lënda e kryer në Shkallën e I-rë. KOSTT-parashtron Ankesë Gj. Qarkut-PR.
17	C.nr.503/11	GJYKATA Komunale Pejë	Pengim Posedi	nn	Sipas kërkesës së Gjykatës KOSTT ka parashtrua precizimin e Padisë.	Pritet ftesa për seancë(para seancës sqarime me Gjyqtarin)	Lënda e aktivizuar nga Gjykata. Pritet caktimi i gjykimit nga Gjykata kompetente dhe përcaktimi i vlerës së kontestit.
18	C.nr.2255/06	GjK-Prishtinë	Kompenzim dami	nn	Sipas kërkesës së Atorizuarit të Padireses me zgjerim të Padisë	Përgjigja në Padi sipas Akt. Gjyqësore u dorëzua më12.11.2011.	Seanca Gjyqësore sipas ftesës. Pritet caktimi i gjykimit nga Gjykata kompetente dhe përcaktimi i vlerës së kontestit.
19	C.nr.0571/2011	GjK-Skenderaj	Anulim i marrëveshjes	10, 000.00 €	Përgjigje në Padi dt.27.01.	Pritet ftesa për seance	Lënda e aktivizuar nga Gjykata.

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	ver. 1.0	faqe 34 nga 42
Departamenti Financiar Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti		

4. Kontratat/transakcionet e konsiderueshme gjatë freemujorit të parë të vitit 2012 nga burimet e KOSTI

Departamenti	Lloji i Prokurimit	Emri i Projektit	KONTRAKTORËT	Vlera e Kontratës	Vlera e Realizuar e Kontratës	Vlera e mbetur për realizim	Nr. i Protokolit
Departamenti i Burimeve Njerëzore	Mini konkurrenca	Furnizim me Softuer-Fresa për Olerum Nr1	ppc IT	290,687.12 €	283,228.47 €	7,458.65 €	nr.67 dt.16/03/2012
Departamenti i Burimeve Njerëzore	Kuotim çmimesh	Furnizim me Material Zyrtar	TT OFFICE	9,950.00 €	3,037.11 €	6,912.89 €	nr.40 dt.07.02.2012
Departamenti i Burimeve Njerëzore	Kuotim çmimesh	Furnizim me Aksesorë	PPC IT	9,900.00 €	1,461.02 €	8,438.98 €	nr.59 dt.23.02.2012
Departamenti i Burimeve Njerëzore	Kuotim çmimesh	Furnizim me Toner	ACE OFFICE	9,900.00 €	6,220.13 €	3,679.87 €	nr.45 dt.09.02.2012
Departamenti i Burimeve Njerëzore	Kuotim çmimesh	Furnizim me Material Higjienik	Capital Ring	9,805.48 €	- €	9,805.48 €	nr.52 dt.16.02.2012
Departamenti i Burimeve Njerëzore	Kuotim çmimesh	Përgatitja e Projektit për aklimatizim dhe ventilitim në Ndërtuesën Afariste të KOSTI-it	Proterm	9,500.00 €	9,500.00 €	- €	nr.15 dt.30.01.2012
Departamenti i Burimeve Njerëzore	Kuotim çmimesh	Renovimi i Fasadës së Objektivit të NS Kosova B me punët përcjellëse	Rexha shpk	9,399.00 €	- €	9,399.00 €	nr.11 dt.26.01.2012
Zyra e Zhvillimit dhe Planifikimit Afatgjatë	procedure e negociuar	Mirëmbajtja e 5 Licencave të Softuerit Profesional PSS/E për vitin 2012	SIEMENS Germany	8,160.00 €	- €	8,160.00 €	nr.105 dt.28.03.2012
Departamenti i Burimeve Njerëzore	Kuotim çmimesh	Furnizim me Letër Toaleti për Duar	UNISERVIS	5,000.00 €	1,024.86 €	3,975.14 €	nr.44 dt.08.02.2012
Departamenti i OS	Kuotim çmimesh	Furnizim me Antena të Radiolidhjeve dhe Instalimi në veturat e KOSTI, Montimi dhe lidhja e Pajisjeve në Qendrën Monitoruese të Radiolidhjeve	Eltong	4,454.49 €	- €	4,454.49 €	nr.64 dt.01.03.2012
TOTALI				366,756.09 €	304,471.59 €	62,284.50 €	

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 35 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

Shtojca 1: Raport mbi funksionimin e Qeverisjes Korporative të KOSTT-it

Raporti mbi funksionimin e Qeverisjes Korporative përfshinë aktivitetet e Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it, bazuar në Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Statutin e Kompanisë dhe Rregulloren e Punës së Bordit. Ky Raport gjithashtu përfshinë edhe punën e Komisionit të Auditimit dhe Komisioneve të tjera të themeluara nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it.

Raporti mbi funksionimin e Qeverisjes Korporative përfshinë aktivitetet e Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it, bazuar në Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Statutin e Kompanisë dhe Rregulloren e Punës së Bordit. Ky Raport gjithashtu përfshinë edhe punën e Komisionit të Auditimit dhe Komisioneve të tjera të themeluara nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it.

Për periudhën raportuese Janar – Mars 2012 Bordi ka mbajtur 2 (dy) mbledhje të rregullta, kurse Komisioni i Auditimit gjithashtu i ka mbajtur 2 (dy) mbledhje të rregullta. Gjatë kësaj periudhe Komisionet tjera (Komisioni i Bordit për projekte Kapitale dhe Komisioni i Bordit për Linjën 400kV Kosovë –Shqipëri) nuk janë takuar. Mbledhjet e tyre priten nga prilli e tutje, bazuar në implementimin e projekteve për të cilat janë themeluar.


Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit janë mbajtur në periudhat kohore sipas Planit të aprovuar të Punës së Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit për vitin 2012.

Çdo mbledhje e rregullt e Bordit ka trajtuar disa pika që paraqiten si pika të rëndomta dhe përfshijnë: vërtetimin e kuorumit dhe aprovimin e rendit të ditës, aprovimin e procesverbaleve nga mbledhjet paraprake të Bordit të Drejtorëve dhe të Komisioneve, raportin nga mbledhja e Komisionit të Auditimit dhe Raportin e Kryeshefit Ekzekutiv.

Mbledhjet në vijim janë paraqitur sipas datës së mbajtjes së tyre.

1. Mbledhja e Komisionit të Auditimit nr. 25/12 e dt

Komisioni i Auditimit me datën 6 Janar 2012 ka mbajtur mbledhjen e rregullt. Komisioni ka shqyrtuar Raportin tremujor të KOSTT-it për periudhën raportuese Tetor – Dhjetor 2011. Komisioni ka vlerësuar se Indikatorët e performancës tregojnë trend pozitiv dhe nuk ka diçka që mund të potencohet krahasuar me periudhën paraprake raportuese. Komisioni ka kërkuar

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 36 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

shpjegim për disa pjesë të raportit dhe ka dhënë sugjerime për disa modifikime të nevojshme. Në lidhje me raportin tremujor KOSTT ka informuar Komisionin se edhe për tetor, nëntor dhe dhjetor 2011 KEK-u ka refuzuar të pranoj faturat e KOSTT-it dhe të bëj pagesën për shërbime të transmissioinit. Në lidhje me kontestin të cilin KOSTT-i e ka iniciuar në ZRRë për shkak të mospranimit (kthimit) të faturave nga KEK-u dhe mospagesën nga KEK-u, Menaxhmenti i KOSTT-it ka informuar Bordin se ZRRë ka vendosur në lidhje me kontestin por pritet Vendimi i ZRRë-së me shkrim.

Komisioni i Auditimit pas shqyrtimit dhe diskutimit rreth raportit për tremujorin Tetor-Dhjetor 2011, ka propozuar që raporti t'i rekomandohet Bordit për shqyrtim dhe aprovim.

Komisioni i Auditimit e ka vlerësuar draft Planin e Punës të Bordit dhe Komisionit të Auditimit për vitin 2012 të propozuar nga Sekretari i Kompanisë. Komisioni ka sugjeruar disa modifikime dhe ka rekomanduar që ky plan t'i dërgohet Bordit për shqyrtim dhe aprovim në mbledhjen e ardhshme të Bordit.


Komisioni gjithashtu ka shqyrtuar edhe Raportin e Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm, ku raportohet për aktivitete audituese në KOSTT. Zyrtari ka potencuar se është i kënaqur me performancën e shumicës së sektorëve dhe departamenteve në KOSTT.

2. Mbledhja e Bordit të Drejtorëve nr. 25/12 e datës 10.02.2012

Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it ka shqyrtuar Raportin tremujor për periudhën raportuese Tetor – Dhjetor 2011. Raporti ka përmbajtur komentet nga Komisioni i Auditimit. Performanca e KOSTT-it është mbi caqet e planifikuara. Indikatorët kyç tregojnë performancë pozitive, vetëm indikatorët T1 dhe T2 tregojnë performancë negative për shkak të ndikimeve të jashtme, të spjegura në Tabelën e IKP-ve. Pas diskutimit dhe shqyrtimit si dhe shpjegimit të pikave në interesim të BD, u konstatua se KOSTT gjatë kuartalit të fundit të vitit 2011 (Q4/2011) ka treguar një performancë të lartë dhe i njëjti është aprovuar.

Bordi gjithashtu ka shqyrtuar draft Planin e punës së Bordit dhe të Komisionit të Auditimit për vitin 2012 të propozuar nga Sekretari i Kompanisë dhe u pajtua me përbërjen e tij, numrin dhe qëllimin e mbledhjeve. Mbledhjet janë përcaktuar bazuar në kërkesat ligjore nga Ligji për Ndërmarrjet Publike. Pas vlerësimit Plani u aprovua nga Bordi.

Bordi në vazhdim të mbledhjes ka shqyrtuar kërkesën për sigurimin e mjeteve buxhetore për riparimin e dëmeve në Ndërprerësit e Fuqisë NF 400 kV në NS 400/220 kV Kosova B dhe blerjen e një ndërprerësi 400 kV për fushën gjeneratorike B1 në NS Kosova B. Kjo rritja e buxhetit do të përdoret për riparimin e dëmeve të shkaktuar me rastrin e eksplozimit me datën 6.01.2012. Si dëshmi të nevojës për rritjen e buxhetit janë dorëzuar edhe arsyetimet teknike të dt. 26.01.2012 dhe

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 37 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

dokumenti “Vlerësimi i dëmeve në pajisje” i datës 23.01.2012, numri i protokollit 45 i përgatitur nga Komisioni Profesional për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në pajisje nga moti i ligë me datën 6.01.2012. Njëkohësisht, KOSTT ka ushtruar edhe kërkesën për blerje të një ndërprerësi 400 kV për fushën gjeneratorike B1 në TS Kosova B në vlerë prej 110,000 Euro. Në total është propozuar që të bëhet rritja e buxhetit në vlerë prej 161,000 Euro, e cila edhe është aprovuar nga Bordi si e arsyeshme.

3. Mbledhja e Komisionit të Auditimit nr. 26/12 e dt. 20.02.2012

Komisioni i Auditimit në mbledhjen e mbajtur më 20.02.2012 ka shqyrtar Draft Elaboratin e regjistrimit të pasurisë së KOSTT-it për vitin 2011.

Komisioni i regjistrimit të pasurisë ka përfunduar punën konform procedurës së aprovuar për regjistrimin e pasurisë. Regjistrimi u bë me kohë dhe janë mbajtur takime dhe konsultime me koordinatorët e komisioneve.

Elaborati paraqet një pasqyrë mbi të gjitha asetet si dhe për asetet që janë propozuar për qitje jashtë përdorimit.

Komisioni i Auditimit ka konstatuar se Elaborati është një material i përgatitur mirë, i përpiluar me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe se Elaborati është një ndër dokumentet themelore për përpilimin e llogarisë përfundimtare të ndërmarrjes, i cili ka vlerë të posaçme dhe si i tillë ti rekomandohet BD për aprovim.


4. Mbledhja e rregullt e Bordit të Drejtorëve nr. 26/12

Me datën 23 Shkurt 2012 Bordi ka mbajtur mbledhjen e tij nr. 26/12.

Bordi ka shqyrtuar Elaboratin e regjistrimit të pasurisë të KOSTT-it për vitin 2011 duke vlerësuar se Elaborati është përgatitur konform standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit. Komentet e Komisionit të Auditimit janë përfshirë në Raport dhe Bordi i Drejtorëve e ka aprovuar. Bordi i ka propozuar shërbimeve përkatëse të KOSTT-it që të bëjnë regjistrimet e duhura me sugjerimet që u dhanë gjatë mbledhjes së Bordit.

Bordi ka vlerësuar kërkesën e KOSTT-it për ndërrim të destinimit të lokalit në Kastriot. Komisioni u informua se lokali i KOSTT-it në Kastriot, dikur ka qenë zyre, ndërsa në vitin 1990 serbët ia kanë ndërruar destinimin, kështu që i kanë shndërruar në banesa. Ndërkaq KOSTT do të kërkojë që këto hapësira prapë të rikthehen në zyre afariste në mënyrë që të ruhet pasuria publike.

Bordi i Drejtorëve ka aprovuar kërkesën për ndërrim të destinimit të lokaleve të KOSTT-it në Kastriot dhe ka urdhëruar që këto hapësira të shndërrohen në zyra afariste.

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 38 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

5. Mbledhja e Komisionit të Auditimit nr. 27/12

Me datën 6 Mars 2012 Komisioni i Auditimit ka mbajtur mbledhjen nr. 27/12.

Gjatë mbledhjes Komisioni i Auditimit së pari ka shqyrtuar Raportin vjetor të KOSTT-it për vitin 2011. Menaxhmenti i KOSTT-it ka dhënë shpjegime për disa pika të Raportit të cilat ishin në interesim të anëtarëve të Komisionit të Auditimit. Komisioni ka dhënë disa sugjerime në Raport dhe ka konstatuar se Raporti Vjetor i përmbush standardet dhe praktikat e mira të deritanishme të KOSTT-it, pasi është i përpiluar konform rregullativës ligjore, standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe i përmbush të gjitha kriteret për shqyrtim nga Bordi i Drejtorëve. Komisioni ka sugjeruar që Raporti Vjetor me vërejtjet e Komisionit të shqyrtohen nga Bordi në mbledhjen e ardhshme.

Komisioni i Auditimit në vazhdimësi ka shqyrtuar kërkesën e KOSTT-it për sigurimin e mjeteve buxhetore për furnizimin/blerjen e 2 (dy) Firewalls për projektin e TI për Operim të Tregut. Komisioni ka vlerësuar që kjo kërkesë është e arsyeshme dhe se duhet t'i dërgohet Bordit për shqyrtim dhe aprovim.

6. Mbledhja e Rregullt e Bordit nr. 27/12 MË 15 MARS 2012


Bordi në mbledhjen e rregullt të tij me 15 Mars 2012 është informuar me çështjet aktuale për periudhën raportuese nga Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT-it.

Bordi është informuar lidhur me aktivitetet për implementimin e Vendimit të Qeverisë për transferin e aseteve 110 kV nga KEK në KOSTT. Bordi ka shprehur kënaqësinë me Vendimin dhe ka shprehur mirënjohje për vendimmarrësit. Poashtu, është cekur se Vendimi është mjaft i favorshëm për KOSTT dhe interesat e konsumatorëve të Kosovës në përgjithësi për finalizimin e aseteve për një afarizëm të suksesshëm të KOSTT.

Bordi u njoftua për nënshkrimin e Marrëveshjes KOSTT-KEK për transferimin e aseteve 400/200/110 kV dhe aprovimin e të njëjtës nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Bazuar në këtë Marrëveshje, BD ka kërkuar nga Menaxhmenti implementimin e Marrëveshjes në bazë të afateve të dhëna dhe përgatitjen e Raportit final për Bordin, pas përfundimit.

Bordi ka shqyrtuar dhe aprovuar Raportin Vjetor të KOSTT-it për vitin 2011 duke vlerësuar se Raporti i përmban të gjitha elementet konform dispozitave ligjore, është gjithëpërfshirës dhe janë paraqitur të gjitha IKP teknike dhe financiare të cilët tregojnë afarizëm pozitiv të KOSTT-it në vitin 2011.

Bordi ka aprovuar kërkesën e KOSTT-it që blerja e 2 (dy) Firewalls për projektin e TI për Operim të Tregut të financohet nga KOSTT-i në vlerë prej 35.000.00 €, për t'i mbuluar të gjitha nevojat e projektit të TI.

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 39 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>


Në vazhdimësi Bordi ka shqyrtuar dhe aprovuar Rregulloren për pagesën e shërbimeve komunale për vlerësimin e dëmeve eventuale gjatë ndërtimit të objekteve elektroenergjetike të Sistemit transmetues (niveli i tensionit 400, 220 dhe 110 kV).

Bordi gjithashtu ka aprovuar kërkesen e KOSTT-it për sigurimin e mjeteve shtesë për rehabilitimin e paisjeve NS Kosova B në vlerë prej 30.000 € në bazë të kërkesës së KOSTT-it.

7. Aktivitete të tjera

Drejtorët e Bordit të KOSTT-it në vazhdimësi kanë qenë në komunikim dhe bashkëveprim me menaxhmentin e KOSTT-it, që ka rezultuar me efikasitet më të madhe në marrjen e vendimeve të nevojshme.

Bordi i Drejtorëve ka qenë i kyçur në të gjitha aktivitetet e natyrës strategjike të KOSTT-it.

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 40 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

Lista e shkurtesave

ATR – Autotransformatori

ATC (Available Transfer Capacity) – Kapaciteti i disponueshëm

BK – Buxheti i Kosovës

BNJ – Burimet Njerëzore

ECLO – (nga angl. European Commission Liaison Office) - Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian

ENTSO E - (European Network of Transmission System Operators for Electricity)- Rrjeti Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike

GjQ – Gjykata e Qarkut

IKP – Indikatorët Kyç të Performancës

KA – Konflikt Administrativ

KEK – Korporata Energjetike e Kosovës

KfW- Banka Gjermane për Zhvillim

KOSTT- Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu

LP – Largpërçuesi

NEF (Net Export Flow) – Eksporti i Kosovës

NIF - (Net Import Flow) – Importi neto për nevojat e Kosovës


NS - Nënstacioni

NP – Ndërmarrjet publike

NJPMNP – Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike

OST – Operator i Sistemit të Transmisionit


PpE - Propozim për Ekzekutim

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 41 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>

SCADA /EMS- (System Control and Data Acquisition/Energy Managment System)-Sistemi i kontrollit dhe grumbullimit të të dhënave/Sistemi i manaxhimit të energjisë

TP - Tatimi në pronë

ZRrE - Zyra e Rregullatorit të Energjisë

	RAPORT TREMUJOR	DT-PB-002
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 42 nga 42</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		
<i>Sektori: Planifikimi Strategjik dhe Buxheti</i>		
